

(都)高田若槻線 街路工事




- 工事概要： 令和元年度 社会資本整備総合交付金(街路)工事 (都)高田若槻線 長野市 桐原～吉田(1工区、2工区、3工区、4工区、5工区、6工区、7工区、8工区、9工区、10工区)
- 工 期： 令和元年10月～令和3年3月下旬
- 発注者： 長野県長野建設事務所 TEL 026-234-9594(代表:026-233-5151)
- (都)高田若槻線 道路建設安全協議会 (事務局連絡先)：(株)北條組 電話番号 026-245-0574(本社)

【工事の進捗状況(11月)】

道路延長 L=872m

早期開通に向けてがんばります！

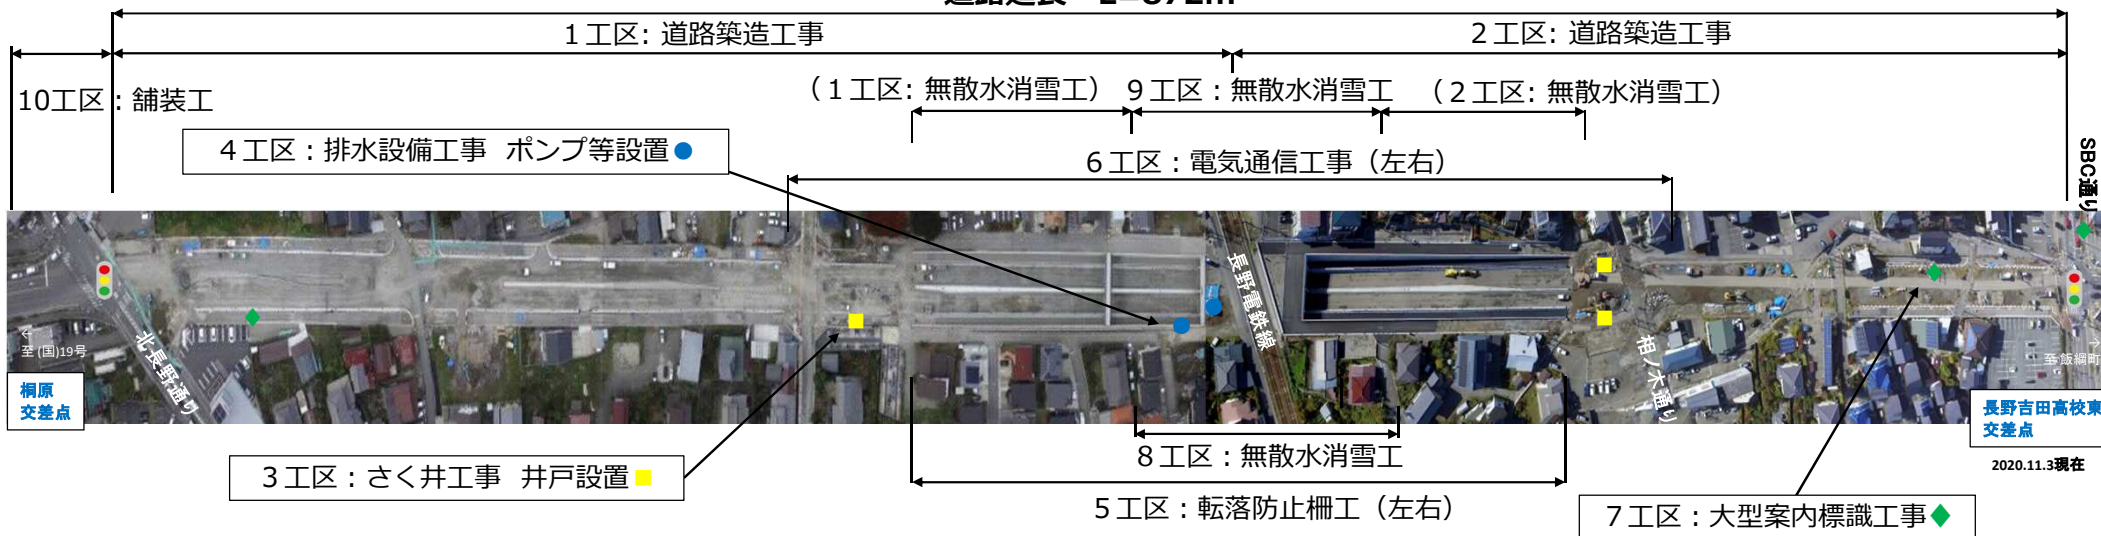

【空撮写真】

長野電鉄線から南側へ



長野電鉄線から北側へ



【内部写真】



【各工区（11月）の工事紹介】

早期開通に向かって全力で進んでいます_(._.)_!?



<p>1工区（南側）：(株)北條組 現場代理人：滝沢 豊 主な工事内容 車道・歩道舗装工 A=9,684m² 側溝工 L=1,919m ほか 無散水消雪工 1式</p>  <p>写真：起点から北を望む</p> <p>現在、北長野野通り側をメインに施工中です。ご不便等をお掛けしますが宜しくお願い致します。</p>	<p>2工区（北側）：(株)塩川組 現場代理人：牧島 吉宣 主な工事内容 車道・歩道舗装工 A=6,655m² 側溝工 L=1,469m ほか 無散水消雪工 1式</p>  <p>写真：相ノ木線から北を望む</p> <p>現在、アンダー側道部で舗装工を施工中です。ご不便をお掛けしますが、皆様方のご理解ご協力をお願いいたします。</p>	<p>3工区：(株)日さく 現場代理人：会津 隆士 主な工事内容 さく井工（井戸掘り）N=3箇所 さく井部ポンプ設置工 1式 ほか</p>  <p>写真：マシンベース設置作業</p> <p>3箇所目の井戸に着手いたしました。11月中には、作業を完了する予定でおります。ご迷惑お掛けすることもあると思いますが、ご協力いただきますようお願いいたします。</p>	<p>4工区：(株)日本アフター工業 現場代理人：渡辺 圭 主な工事内容 排水ポンプ設置工 N=3基 受電設備設置工 1式 ほか</p>  <p>写真：配線用ダクト取付け</p> <p>写真は配線用ダクト取付け作業の様子になります。今後、内部電気配線を行っていく予定です。ご不便をお掛けしますがよろしくお願い致します。</p>	<p>5工区：(株)アスペック 現場代理人：山崎 博正 主な工事内容 転落防止柵工 L=550.0m</p>  <p>写真：施工箇所支柱位置だし</p> <p>測量・調査完了 割付け検討中 11月末、アンカー削孔作業を予定しています</p>
<p>6工区： 矢木コーポレーション(株) 現場代理人：山田 謙一郎 主な工事内容 道路照明 1式、道路冠水警報設備 1式 防犯設備 1式 ほか</p>  <p>写真：カルバート部配管ダクト</p> <p>現在、照明基礎、照明ハンドホール、埋設配管を施工中です。照明設備、道路冠水警報設備を製作中です。柱を建てたり、機器の設置は12月頃を予定しています。</p>	<p>7工区： 矢木コーポレーション(株) 現場代理人：奥野 忠 主な工事内容 大型案内標識設置工 N=8箇所 警戒標識設置工 1式</p>  <p>写真：標識完了写真</p> <p>現在、標識板を設置しております！</p>	<p>8工区： 共進建設(株) 現場代理人：今井 美鈴 主な工事内容 無散水消雪工 1式（右側）</p>  <p>写真：起点より終点側を望む</p> <p>現在、施工準備中！</p>	<p>9工区：(株)アスペック 現場代理人：柳沢 和幸 主な工事内容 無散水消雪工 1式（左側）</p>  <p>写真：起点より終点を望む</p> <p>現在、施工準備中！</p>	<p>10工区： 日本綜合建設(株) 現場代理人：林田 健治 主な工事内容 ＜桐原交差点 舗装工＞ 本線 L=110.3m 市道 L=103.0m ほか</p>  <p>写真：本線起点側（新幹線頭上）より望む</p> <p>現在、施工計画策定中です。施工に際しましてはご不便お掛け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます。</p>
