

■ 明けましておめでとうございます。日頃より、道路行政にご協力いただきありがとうございます。皆様のご協力により、各工区とも順調に工事が進んでおります。今月より新たに野底地区の1現場が協議会に加わり、着工となります。また、福島地区にて2現場が無事工事が完了しました。引き続き工事へのご理解、ご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。この広報誌では月に1回、下記工事の紹介を皆様にお伝えします。工事に対し、お気づきの点、ご意見等ありましたら、最終項記載の連絡先までご連絡ください。

福島周辺の全景写真（R1年12月末撮影）




野底周辺の全景写真（R1年12月末撮影）



前原・上牧周辺の全景写真（R1年12月末撮影）



伊那バイパス 工事箇所見取図

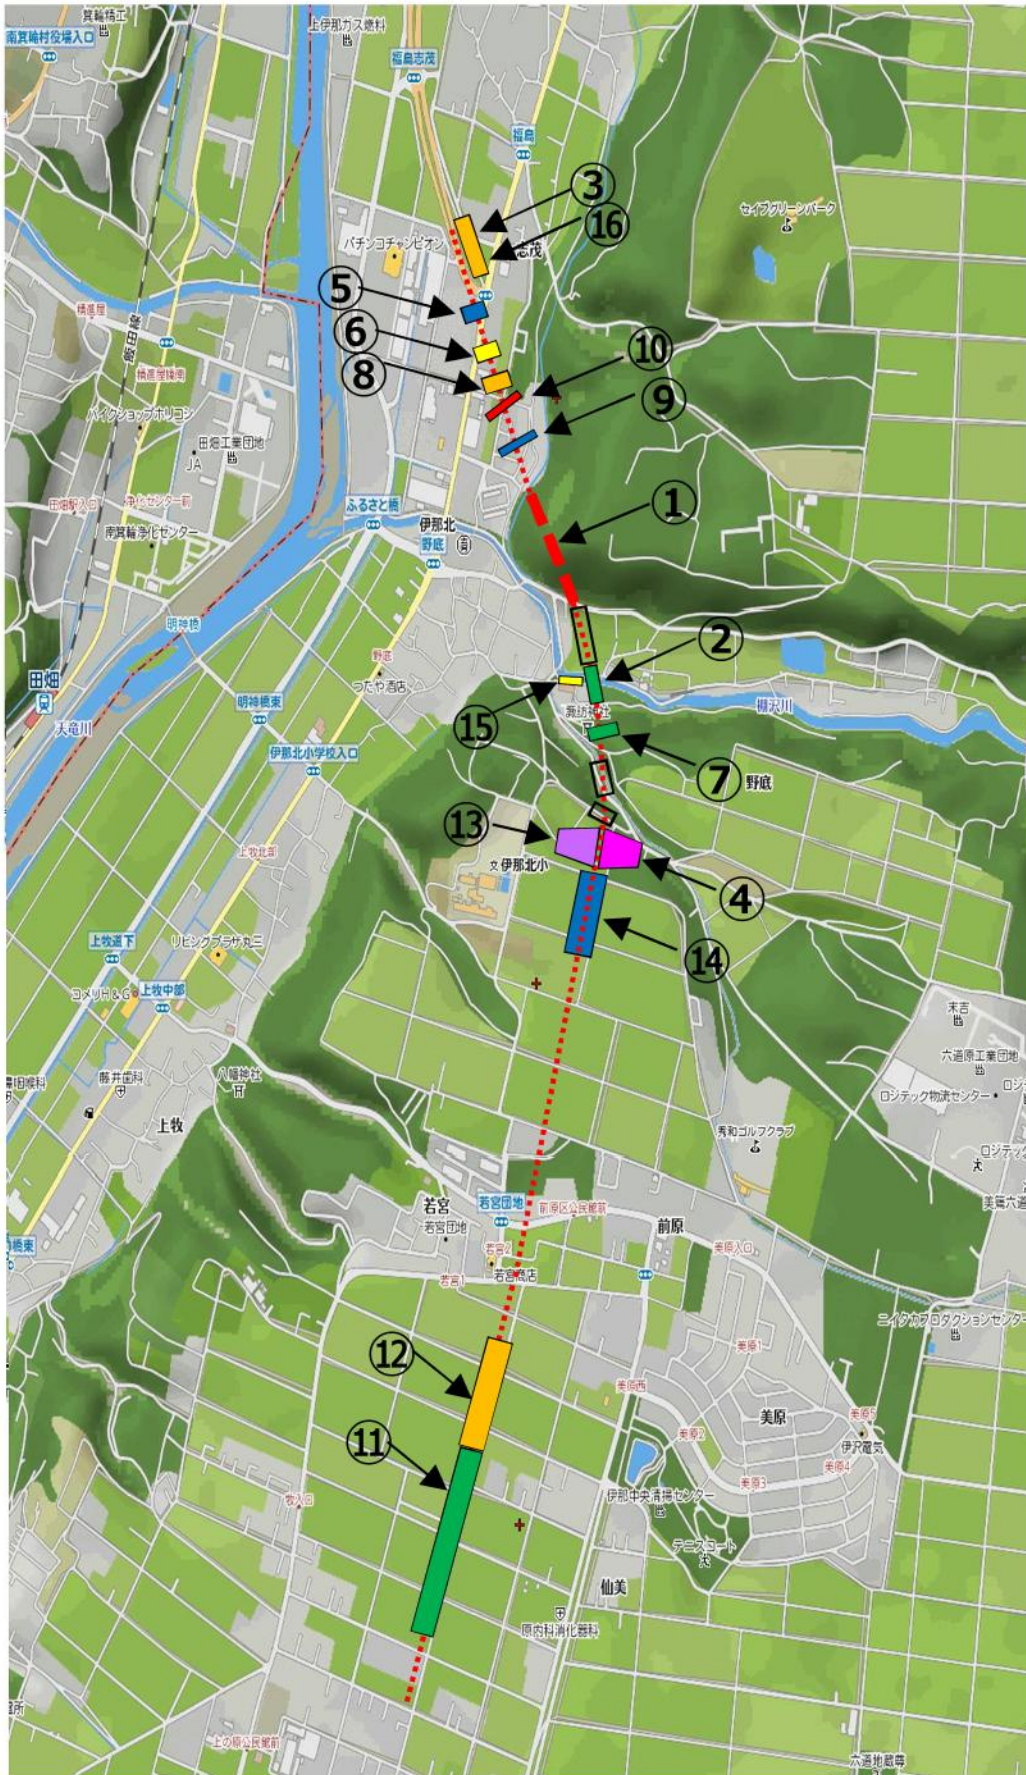

番号	施工業者 個所 工期	地区 進捗率
①	岡谷組・浅川建設工業JV H29令和伊那トンネル H29.03.14~R2.02.28	福島 96.0%
②	(株)角藤 H30BP1工区野底大橋 H30.01.22~R2.02.05	野底 89.2%
③	エフ・ケー建設(株) H30BP2工区道路築造工 H30.02.06~R1.12.25	福島 竣工
④	南重建設(株) H30BP3工区道路築造工 H30.03.05~R1.03.18	野底 78.7%
⑤	宮下建設(株) H30BP4工区福島立橋P2橋脚 H30.0.14~R1.12.27	福島 竣工
⑥	西武建工(株) H30BP5工区福島立橋P1橋脚 H30.03.14~R2.03.27	福島 71.0%
⑦	西武建工(株) R1BP2工区福島立橋A1橋台 R1.10.01~R2.06.08	福島 43.3%
⑧	守屋建設(株) R1BP3工区ホックスカルパート R1.08.30~R2.05.07	野底 76.8%
⑨	西武建工(株) R1BP4工区ホックスカルパート R1.09.11~R2.06.08	福島 17.0%
⑩	清野建設(株) R1BP5工区ホックスカルパート R1.09.12~R2.05.08	福島 11.0%
⑪	廣瀬建設工業(株) R1BP6工区道路築造工 R1.08.30~R2.05.25	前原 5.1%
⑫	宮下建設(株) R1BP7工区道路築造工 R1.08.29~R2.05.25	前原 4.0%
⑬	池田建設(株) R1BP8工区道路築造工 R1.09.09~R2.06.04	野底 0.0%
⑭	エフ・ケー建設(株) R1BP9工区道路築造工 R1.10.01~R2.06.26	野底 0.0%
⑮	入戸建設工業(株) R1棚沢川河川改修工事 R1.10.01~R2.03.30	野底 0.4%
⑯	宮下建設(株) R1BP11工区道路舗装工 R1.12.01~R3.07.17	福島 0.0%

お気づきの点、ご意見等ありましたら、下記連絡先までご連絡ください。

【連絡先】

伊那建設事務所 整備課 整備第三係
住所：伊那市 荒井 3497
TEL：0265-76-6853

伊那バイパス工事安全協議会 事務局
(株)角藤 H30伊那BP1工区作業所
TEL：0265-78-1816
