

令和元年度社会資本整備総合交付金(道路)工事
(国)153号 伊那市 伊那バイパス6工区

日頃より地域の皆様には工事に対し多大なる御協力をいただき、誠にありがとうございます。


本格的に現場が施工できるようになり約1か月が過ぎました。現在、盛土（他工事より盛土材搬入）、取付道路及び水路工を行っています。また、地元説明会でお願いをした、道路切り替えを2月中旬から3月初旬予定で現在進めています、日程等決まりましたら回覧を行いますのでよろしくお願ひします。

また、工事の進捗状況につきましては、その都度ご報告をさせていただきますので、今後ともよろしくお願ひいたします。



起点より

工事区分	工種	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月
舗装	道路土工		■							
	舗装工		■							
	排水溝蓋工		■							
	縁石工		■							
	仮設工		■							



進捗状況

22.00%



廣瀬建設工業株式会社

長野県伊那市日影334-3

TEL 0265-72-2714

FAX 0265-72-2728




現場代理人
池上 邦彦



主任技術者
水野 廣一

令和元年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事 伊那バイパス7工区

伊那バイパス7工区を施工しております。宮下建設株式会社です。
埋蔵文化財調査が終わり、本格的に工事を開始しました。現在は土砂の搬入
及び水路工を施工中です。引き続き土砂の搬入を行っていきます。車両の通
行は安全に留意して行いますのでよろしくお願い致します。
また2月中旬～3月上旬に道路の切り替えを予定しております。時期が決定次
第、資料を回覧しますのでご理解とご協力をお願い申し上げます。
なお工事の進捗状況等はその都度ご報告させていただきますので宜しくお願い
致します。

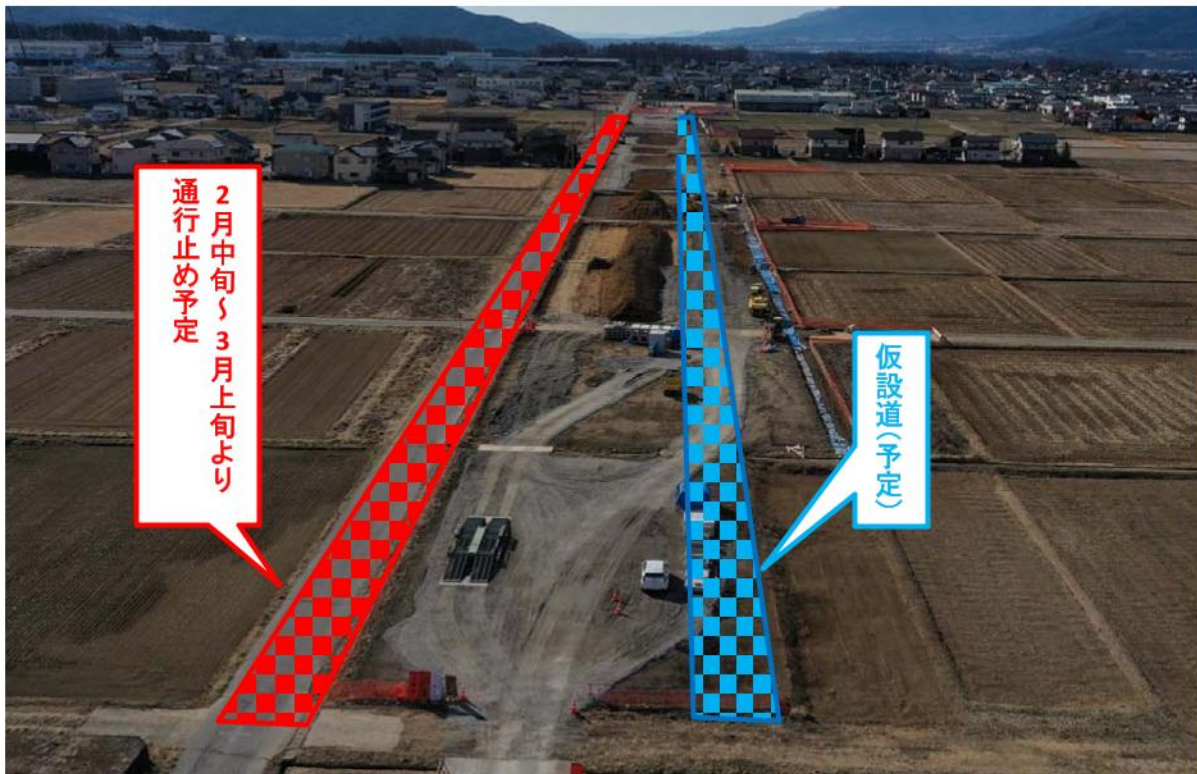

2月中旬～3月上旬より
通行止め予定

仮設道(予定)

工期 令和元年8月29日～5月25日
令和2年1月末現在 工事進捗率 14.2%



現場代理人
清水 穂岳

