

令和元年度社会資本整備総合交付金(道路)工事
(国)153号 伊那市 伊那バイパス6工区

日頃より地域の皆様には工事に対し多大なる御協力をいただき、誠にありがとうございます。


1次施工（東側）も終わり、2月27日に道路切替を行いました。現在、2次施工に入り引続き盛土（他工事より盛土材搬入）、取付道路及び水路工を行っています。3月末に水路工が完成するように現在工事を進めています、道路の切り替え等によるご不便を御掛けしておりますが今後ともご、理解をお願いいたします。

また、工事の進捗状況につきましては、その都度ご報告をさせていただきますので宜しくお願いいたします。



起点より

工事区分	工種	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	
舗装	道路土工		■								
	舗装工			■							
	排水溝工			■							
	縁石工			■							
	仮設工		■								



進捗状況

40.0%



廣瀬建設工業株式会社

長野県伊那市日影334-3

TEL 0265-72-2714

FAX 0265-72-2728




現場代理人
池上 邦彦



主任技術者
水野 廣一

令和元年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事 伊那バイパス7工区

伊那バイパス7工区を施工しております。宮下建設株式会社です。
2月末に西側の1次施工が終わり、2次施工に入り、東側の水路工および土工を行っていきます。
施工にあたり道路の切り替えを下記のとおり行いましたので、仮設道路への迂回及び通行止めへの御協力をお願い申し上げます。
工事の進捗状況等はその都度ご報告させていただきますので宜しくお願い致します。

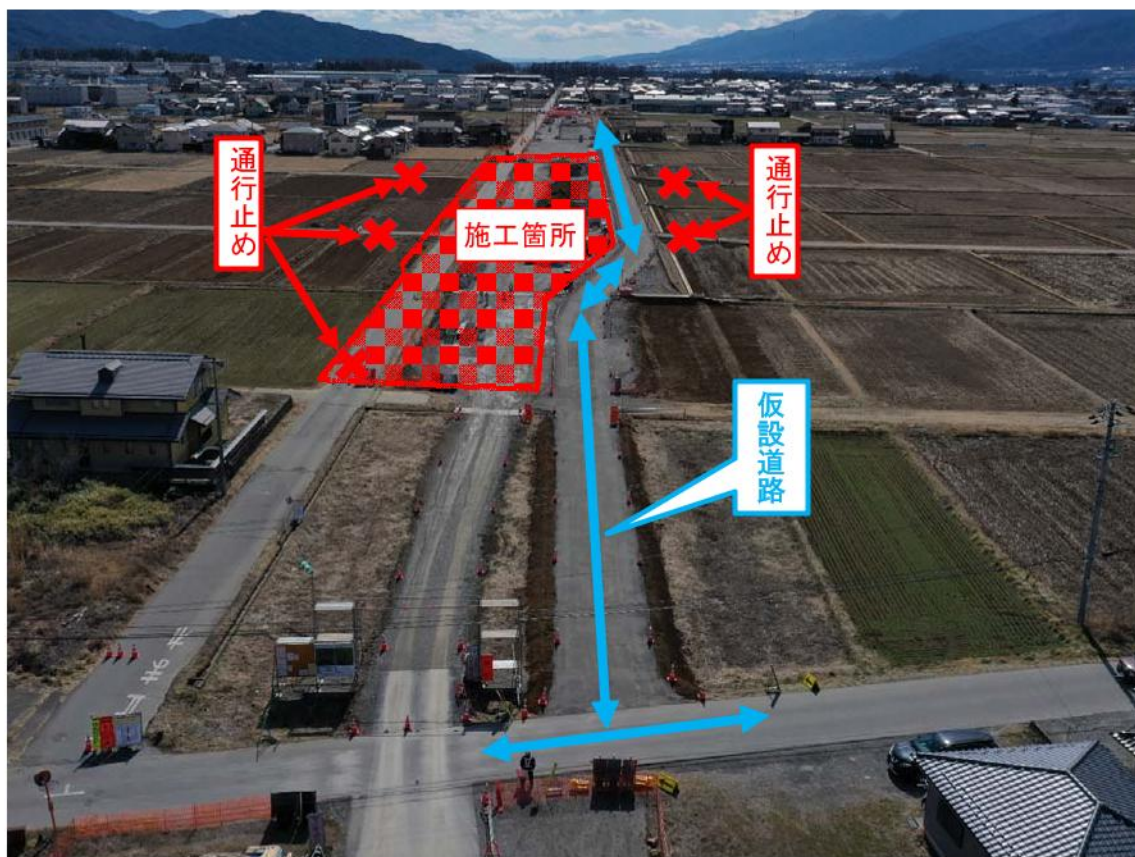

工期 令和元年8月29日～令和2年5月25日
令和2年2月末現在 工事進捗率 21%



現場代理人
清水 穂岳

