



令和元年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事 伊那バイパス7工区

伊那バイパス7工区を施工しております。宮下建設株式会社です。
7月は下の写真の示すように迂回路を作製し、仮設道路の切り回しを行い、施工箇所を東側から西側に移しました。8月は西側の道路付属施設を作成していきます。
工事の進捗状況等はその都度ご報告させていただきますので宜しくお願い致します。

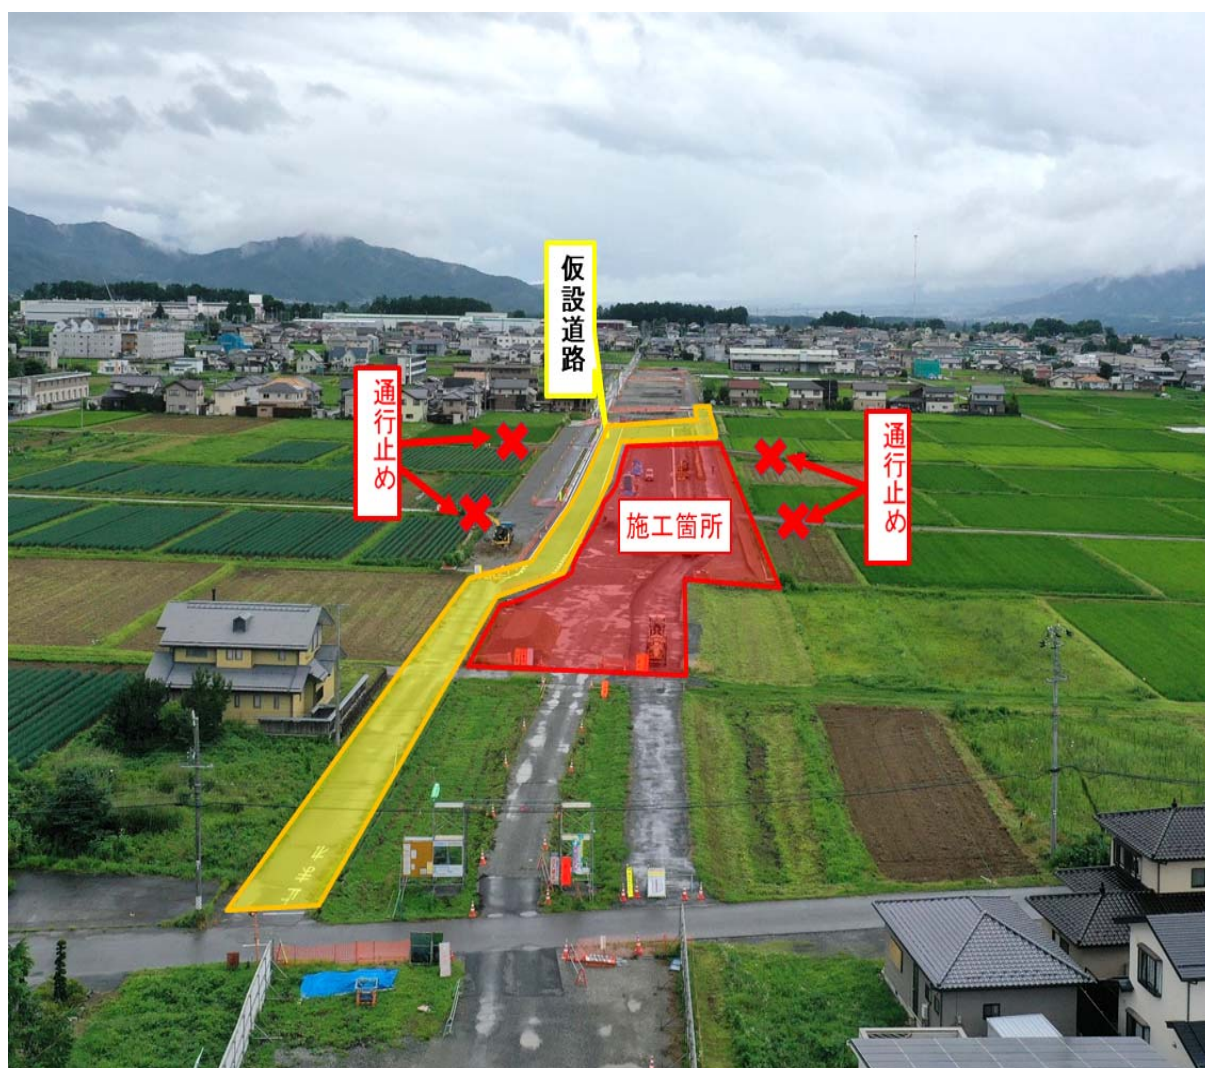

現場代理人
清水 穂岳

工期 令和元年8月29日～令和2年9月25日
令和2年7月末現在 工事進捗率 70%


伝統が培う技術と信頼

宮下建設株式会社

伊那市上牧6474番地
☎72-3191

令和元年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事 伊那バypass工区

7月の降雨により側道の一部が崩落し、ご心配をおかけしました。今後、原因究明及び設計を行い、対策工事を進めます。
8月も水路を中心に工事を進めて参ります。また、伊那市の分につきましては8月中に舗装工事を行い完了する予定ですので、工事車両の出入り等引き続きご協力をお願い致します。

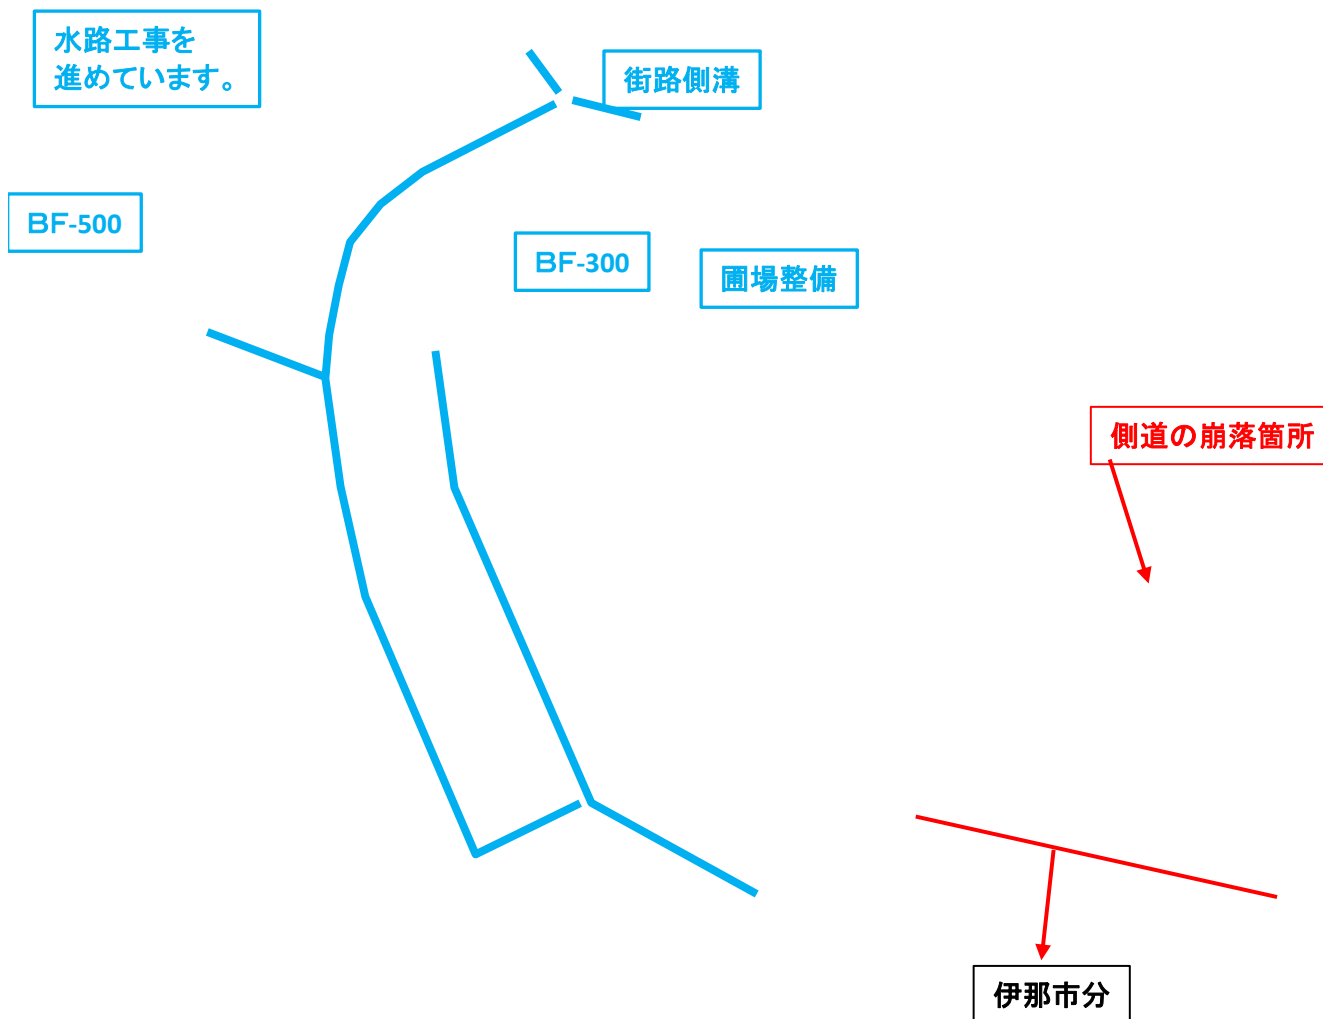

工期：令和元年9月9日 ～ 令和2年10月31日
令和2年7月末 工事進捗率（60%）

池田建設株式会社

長野県 伊那市 日影 329-1
TEL 0265-72-3422 FAX 0265-72-3790

現場代理人：武田 巖

令和元年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事 伊那バイパス9工区

梅雨明けの暑さひとしおでございます。

皆様におかれましては未曾有の災禍の中ご苦労はいかほどかと拝察いたします。

日頃より建設工事へご理解ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。

現在、9工区では先月に引続きバイパス本線部分の掘削と土砂の運搬を行っております。周辺の通行に大変ご不便をお掛けいたしますが、安全には十分に留意してまいりますので、よろしくお願い致します。先を見通しづらい状況ですが一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と、皆様のご健康をお祈り申し上げます。

工事概要： 道路築造工 L=200m W=7.0(28.0)m

道路土工 V=16,700m³

施工状況： バイパス本線の掘削を行い、土砂を運び出しています。

朝夕は現場をぐるっと1周(約1.0km)できるウォーキングロードをどうぞご利用ください。



現場代理人の 笠原 悠 です。

令和2年 7月末 進捗率 19.4%

工期： 令和元年10月1日 ~ 令和2年10月30日



エフ・ケー建設株式会社

長野県伊那市日影53番地

TEL 0265-78-9010 FAX 0265-78-9110

<http://www.fk-earth.com>
