



伊那新校（仮称）建設工事（第一期） 6月度工事月次報告書

◆設計・工事監理 暮らしと建築社・みかんぐみ共同企業体 ◆建築工事 (株)ヤマウラ ◆電力・弱電設備工事 (株)林電機 ◆空調・衛生設備工事 (株)シノダ設備


Schedule

工種 / 月	2026年												2027年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
基礎工事																								
外構工事																								
木工事																								
屋根・外壁工事																								
内装工事																								
合宿所改修																								
部室・渡り廊下																								

伊那新校（仮称）建設工事（第一期）杭工事完了、基礎工事着手始めました。

4月末より一か月間にわたり実施しておりました、杭工事につきましては、予定よりも早く杭設置が完了しました。
6月からは建物を支える基礎工事が本格的に始まっています。基礎の鉄筋及び型枠の検査を複数の目で行い、厳格な品質管理のもと作業を進めています。基礎コンクリート打設工事の際には車両の往来が多くなります。
引き続き、市道二条線上での交通誘導と徐行運転を徹底し、安全確保に努めていきます。
皆様におかれましては、本工事へのご理解とご協力を賜り、大変感謝申し上げます。
引き続きご不便、ご迷惑をお掛けしますが、安全第一に細心の注意を払って工事を進めてまいります。
今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

※杭工事とは・・・建物の荷重を地中の硬い地盤まで伝えるために、地面に打ち込んだセメント改良体（杭）の設置を行うことです。

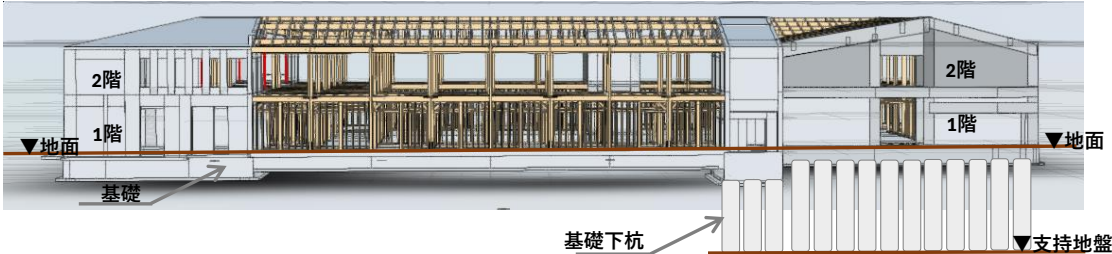

2026.06.30基礎配筋～型枠～コンクリート打設実施状況

2026.06.01基礎掘削開始状況




2026.06.12基礎配筋施工状況



2026.06.30基礎工事施工状況



2026.06.01～2026.06.30 工事進捗 時系列 写真状況

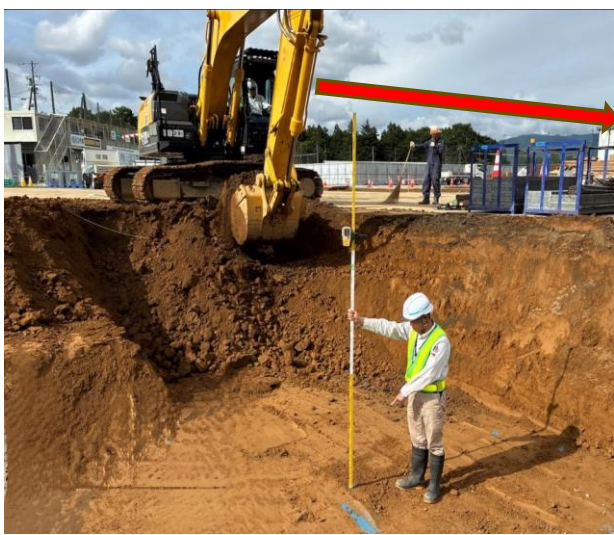

◀ 6月1日、基礎下10m以上まで到達させた杭を166本設置完了。工事完了後杭打機の解体を行いました。その後は基礎の掘削工事を行っています。



▲ 自動車のナビと一緒にイメージです。自動車ナビの建設重機バージョンです。

◀ 基礎掘削工事では掘削位置と深さを重機にデータ入力。衛星電波を受信して自分の位置と掘削位置を画面上でガイダンスしてくれます。⇒IT化、省力化、省人化として安全性の確保かつ精度向上としています。



鉄筋組立状況。▶ 組立て後は自主検査後、◀ 設計監理者検査を行っています。



▲ 6月27日～6月29日伊那北高校でペン祭、伊那弥生ヶ丘高校で弥生祭が開催されました。



72 t h ペン祭



67 t h 弥生祭



▲▶ コンクリートをミキサー車で搬入、ポンプ車で圧送して基礎型枠内にコンクリートを流し込みます。

