



伊那新校（仮称）建設工事（第一期） 7月度工事月次報告書

◆設計・工事監理 暮らしと建築社・みかんぐみ共同企業体 ◆建築工事 (株)ヤマウラ ◆電力・弱電設備工事 (株)林電機 ◆空調・衛生設備工事 (株)シノダ設備

Schedule

工種 / 月	2026年												2027年											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月			
基礎工事																								
外構工事																								
木工事																								
屋根・外壁工事																								
内装工事																								
合宿所改修																								
部室・渡り廊下																								

伊那新校（仮称）建設工事（第一期） 全域で基礎工事を行っています。

建物全域にわたり、基礎工事へ本格的に着手しました。西棟は鉄筋コンクリート造と木造の混合構造となります。

建物の基礎においても、それぞれの構造に応じた基礎形状となっており、工程の進捗に合わせた品質管理を行いながら、

工事を進めております。コンクリート打設時にはミキサー車の往来が多くなります。


引き続き、市道二条線上での交通誘導と徐行運転を徹底し、安全確保に努めていきます。

皆様におかれましては、本工事へのご理解とご協力を賜り、大変感謝申し上げます。

引き続きご不便、ご迷惑をお掛けしますが、安全第一に細心の注意を払って工事を進めてまいります。

今後とも、どうぞ宜しくお願い致します。

※杭工事とは・・・建物の荷重を地中の硬い地盤まで伝えるために、地面に打ち込んだセメント改良体（杭）の設置を行うことです。

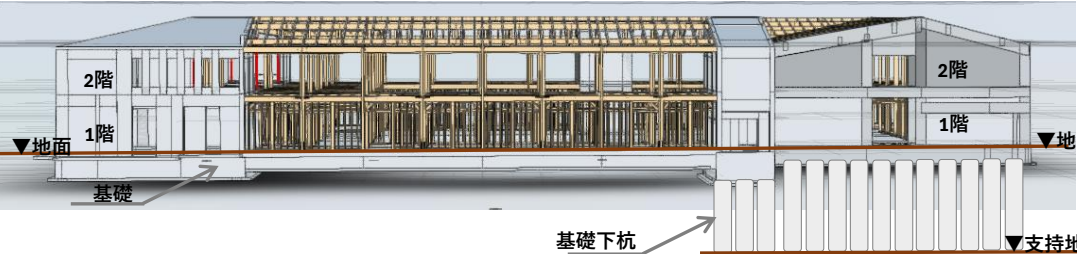

2026.07.31 基礎配筋～型枠～土間コンクリート打設実施

2026.07.01基礎配筋施工状況



2026.07.15基礎型枠施工状況



2026.07.31土間コンクリート打設施工状況



2026.07.01～2026.07.31 工事進捗 時系列 写真状況



写真①



写真②



写真③

▲ 基礎組立て状況です。
写真① 基礎の骨組みとなる鉄筋を組立てます。
写真② 基礎の形を作るために、鉄筋の周囲に型枠を設置してコンクリートを流し込む準備を行います。
写真③ コンクリート打設後、養生を行い、型枠を外すと基礎が形成されます。



▲ 土間配筋を組立た後に、コンクリート打設を行います。コンクリート打設後は、左官職人がコテを使用して押さえ込みを行うことで、平滑な仕上げになります。



▲ 消防用の防火水槽は工場で製作したものを大型トラックで搬入して、現場にクレーンで設置を行います。



▲ 35℃以上の猛暑日が続きます。現場では様々な熱中症対策を行いながら安全に工事を進めています。

▶ 下水道配管工事のため、合宿所南側の駐輪場を一部解体しました。

