

(都)高田若槻線 街路工事




- 工事概要： 令和元年度 社会資本整備総合交付金(街路)工事 (都)高田若槻線 長野市 桐原～吉田(1工区、2工区、3工区、4工区、5工区、6工区、7工区、8工区、9工区、10工区)
- 工 期： 令和元年10月～令和3年3月下旬
- 発注者： 長野県長野建設事務所 TEL 026-234-9594(代表:026-233-5151)
- (都)高田若槻線 道路建設安全協議会 (事務局連絡先)：(株)北條組 電話番号 026-245-0574(本社)

【工事の進捗状況(12月)】

道路延長 L=872m

年末です。無事故無災害で、がんばります！

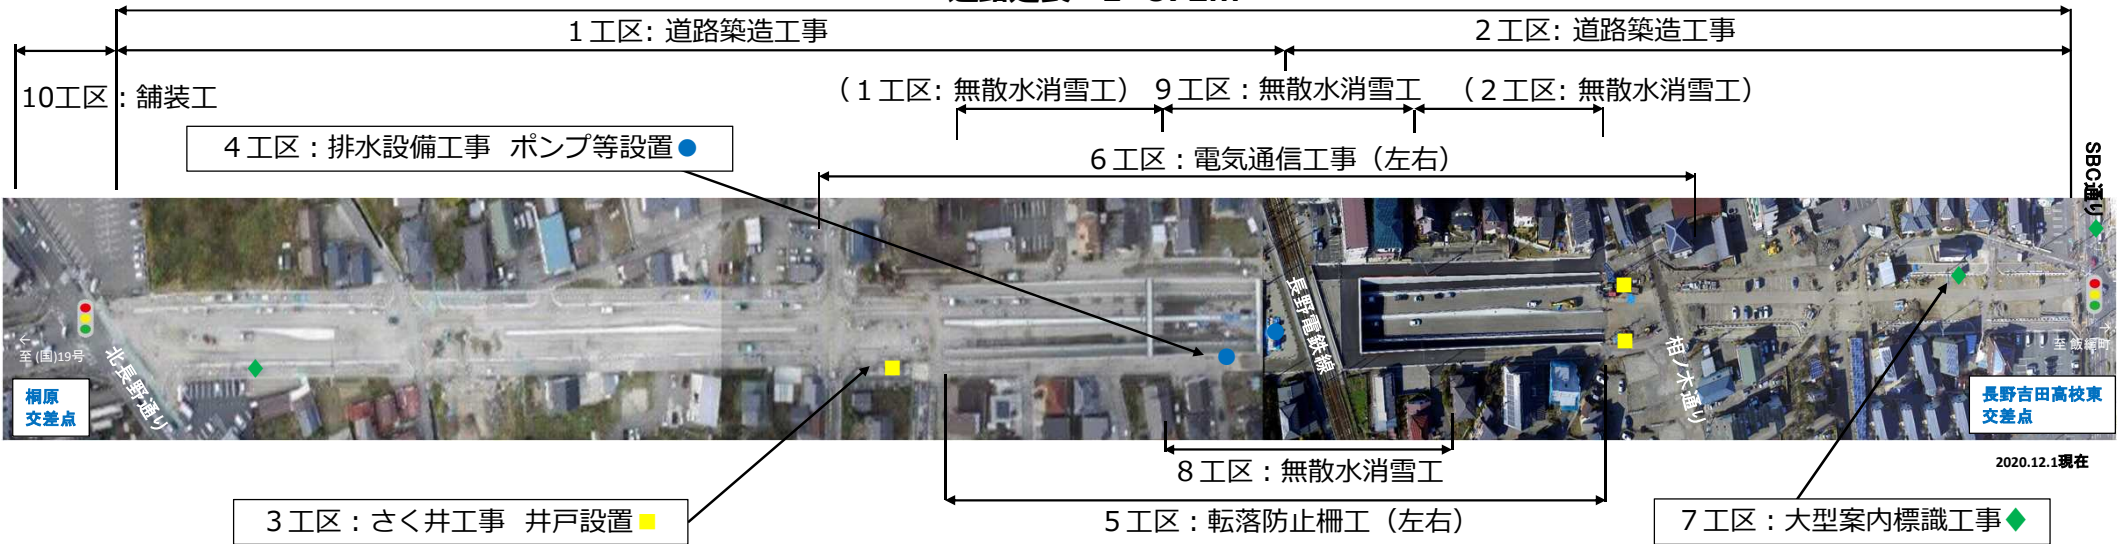

【空撮写真】

桐原牧神社から南側へ



SBC通りから南側へ



【内部写真】



【各工区（12月）の工事紹介】

年末です！無事故無災害でご安全に！_(._.)_!？



<p>1工区（南側）：(株)北條組 現場代理人：滝沢 豊 主な工事内容 車道・歩道舗装工 A=9,684m² 側溝工 L=1,919m ほか 無散水消雪工 1式</p>  <p>写真：地区との打合せ状況</p> <p>開通に向かって頑張っています！！</p>	<p>2工区（北側）：(株)塩川組 現場代理人：牧島 吉宣 主な工事内容 車道・歩道舗装工 A=6,655m² 側溝工 L=1,469m ほか 無散水消雪工 1式</p>  <p>写真：相ノ木線から北を望む</p> <p>現在、本線部で水路・縁石他を施工中です。ご不便をお掛けしますが、皆様方のご理解ご協力をお願いいたします。</p>	<p>3工区：(株)日さく 現場代理人：会津 隆士 主な工事内容 さく井工（井戸掘り）N=3箇所 さく井部ポンプ設置工 1式 ほか</p>  <p>写真：井戸ケーシング挿入作業</p> <p>3本目の井戸掘削が完了し、能力試験を実施しております。今後、井戸ポンプ設置他、設備工事に着手する予定ですので、引き続き、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。</p>	<p>4工区：(株)日本アフター工業 現場代理人：渡辺 圭 主な工事内容 排水ポンプ設置工 N=3基 受電設備設置工 1式 ほか</p>  <p>写真：配線用ダクト取付け</p> <p>写真はダクト内を電気配線作業の様子になります。今後は電気設備周りをフェンス設置していきます。ご不便をお掛けしますがよろしくお願い致します。</p>	<p>5工区：(株)アスベック 現場代理人：山崎 博正 主な工事内容 転落防止柵工 L=550.0m</p>  <p>写真：アンカー作業のための仮設落下防止</p> <p>防護柵の工場製作中。アンカー作業は17日頃完了予定。防護柵設置は、1月下旬の予定であります。宜しくお願い致します。</p>
<p>6工区：矢木コーポレーション(株) 現場代理人：山田 謙一郎 主な工事内容 道路照明 1式、道路冠水警報設備 1式 防犯設備 1式 ほか</p>  <p>写真：アンダーパス部道路照明</p> <p>現在、交差点関連の基礎工、埋設配管工を施工しています。12月中にカルバー内照明を施工します。</p>	<p>7工区：矢木コーポレーション(株) 現場代理人：奥野 忠 主な工事内容 大型案内標識設置工 N=8箇所 警戒標識設置工 1式</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 20px;">竣工</div>  <p>写真：標識設置完了</p> <p>全ての標識を設置完了しました。地元の皆様はじめ各関係者皆様、短い期間でありましたが、大変お世話になりました。</p>	<p>8工区：共進建設(株) 現場代理人：今井 美鈴 主な工事内容 無散水消雪工 1式（右側）</p>  <p>写真：無散水消雪工 送集水管完了</p> <p>井戸から消雪設備に水を送る管が完了しました。年明けのコンクリート舗装打設の際は、ミキサー車等の往来でご不便をおかけいたしますが、皆様のご理解とご協力をお願いいたします。</p>	<p>9工区：(株)アスベック 現場代理人：柳沢 和幸 主な工事内容 無散水消雪工 1式（左側）</p>  <p>写真：送集水管 防護生コンクリート打設</p> <p>年内、25日を目標に防護コンクリート（脱型まで）完了を目指しております。生コンクリート搬入の際は、宜しくお願い致します</p>	<p>10工区：日本綜合建設(株) 現場代理人：林田 健治 主な工事内容 ＜桐原交差点 舗装工＞ 本線 L=110.3m 市道 L=103.0m ほか</p>  <p>写真：本線起点側（新幹線頭上）より望む</p> <p>年明け早々からの施工開始に向けて準備中です。施工に際しましては、ご不便お掛け致しますが何卒よろしくお願い申し上げます。</p>
