

日頃より、道路行政にご協力いただきありがとうございます。

今年の夏は、例年になく酷暑と思えば、急に大気が不安定となり、場所によっては20mm/hを超えるような大雨が降ったりと、皆様も、この気まぐれ天気に四苦八苦されているのではないかと思います。

この広報誌では月に1回、下記工事の紹介を皆様にお伝えします。

工事に対し、お気づきの点、ご意見等ありましたら、最終項記載の連絡先までご連絡ください。

野底周辺の全景写真（H30年8月末撮影）



平成29年度 伊那バイパス 1 工区（学校線カルバート工事）

(株)ヤマウラ

平成29年度 伊那バイパス 3 工区（伊那バイパス本線橋台工事）

守屋建設(株)

平成29年度 伊那バイパス 5 工区（伊那バイパス本線上部工工事）

(株)角藤

平成29年度 伊那バイパス 野底福島トンネル

岡谷組・浅川建設工業
JV

平成29年度 社会資本整備総合交付金(道路)工事 伊那バイパス1工区

夜には虫の音が心地よい季節となりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。
当工事では酷暑となった8月も順調に作業が進み、ボックスカルバート3基
のうちの、最後のブロックに着手しております。

9月中旬と、10月中下旬にコンクリートの打ち込み作業を行い、ボックス
カルバートは11月末に完成する予定です。

打設や掘削の際には、多くの大型車両が出入りします。通行される皆様には
大変ご迷惑をお掛け致しますが、引き続きご理解、ご協力をお願いします。

型枠解体状況



大きな型枠のまま
取外し、陸で解体
することでリスク
のある高所作業を
削減しています！

熱中症対策状況



現場には屋根が
無いので、日陰を
作ったり、ミスト
を噴射したりして
熱中症対策を実施
しています。

定点撮影（8月末撮影）



最後のカルバートが
ここに出来ます。



現場代理人
大嶋 邦親

平成30年8月末 工事進捗率 60.2%

工期：平成29年10月20日～平成31年2月18日

Yamaura 株式会社ヤマウラ

【株式会社ヤマウラ 土木支店】TEL：0265-82-4812

【伊那バイパス作業所】TEL：0265-96-0531

平成29年度 社会資本整備総合交付金（道路）工事 伊那バイパス5工区（橋梁上部工）

現在、橋梁上部工は橋桁の工場製作加工を行なっています。
製作が完了した橋桁（主桁）は、デジタルカメラ三次元計測システムにて
出来形測定をおこなっています。
今月は、現地にて架設準備作業を行います。
工事施工中は、安全確保と地域住民の皆様の生活環境保全を第一に考え、
無事故での完成を目標に施工したいと考えております。

工事概要

橋長 L=230.30m(施工 L=133.8m)

形式 鋼5径間連続非合成I桁橋

施工:3径間

(P2橋脚～P3～P4～A2橋台)



鋼重 417.5t

鈹桁 H=2.6m 5主桁


工期 平成30年3月13日

～平成31年5月27日

進捗率 43.6%

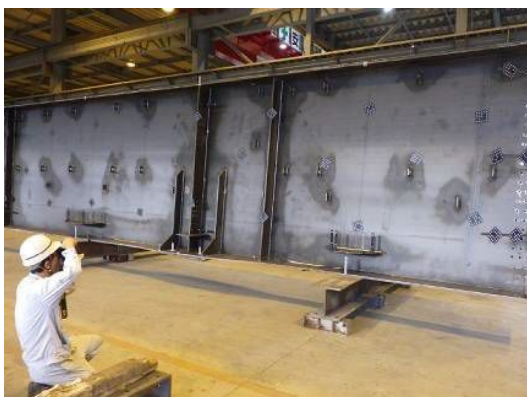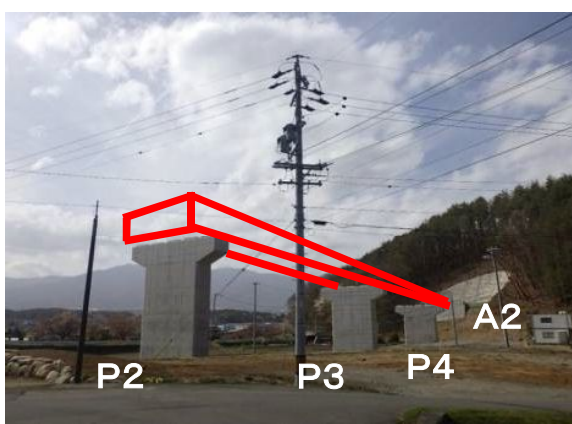

橋桁 出来形測定(カメラ計測)

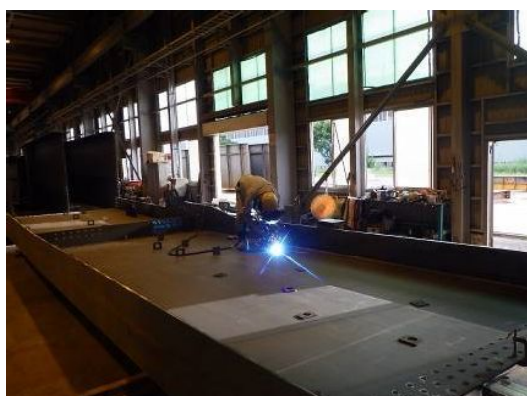

橋桁 組立溶接状況



現場担当者

島田 治則



株式会社 角藤

橋梁事業部 : 長野県上高井郡高山村大字高井6100-10

TEL:026-246-7240 FAX:026-246-7246



番号	工事担当会社	工期	工事概要	進捗率 【H30.8月末】
	(株)ヤマウラ	H29.10.20~H31.02.18	市道学校線 加幅 -ト3基他	60.2%
	守屋建設(株)	H30.03.13~H30.10.18	BP本線 橋台1基 他	58.6%
	(株)角藤	H30.03.13~H31.05.27	BP本線 上部工(3径間)	43.6%
	岡谷組・浅川建設工業JV	H30.03.14~H31.07.08	BP本線 トンネル166.7m	11.0%

お気づきの点、ご意見等ありましたら、下記連絡先までご連絡ください。

【連絡先】

伊那建設事務所 整備課 整備第三係
 住所：伊那市 荒井 3497
 TEL：0265-76-6853

伊那バイパス工事安全協議会 事務局
 (株)ヤマウラ H29伊那BP1工区作業所
 TEL：0265-96-0531
