

# 長野県立大学(仮称)の施設整備について

総務部県立大学設立準備課

## 1 施設概要


### 《基本的視点》

教育目標「グローバルな視野でイノベーションを創出し地域のリーダーとなる人材育成」実現のため、基本構想に示した教育内容や学生の主体的な学び、多様な交流を施設面から積極的に支援する。

### キャンパスの特長

- (1) キャンパス全体が学びの空間 (2) 多様な活動の「見える化」 (3) 教育寮での学びと交流、地域との連携  
(4) 機能的で高コストパフォーマンス (5) 環境・景観との調和

### 【三輪キャンパス（新校舎）：鳥瞰】

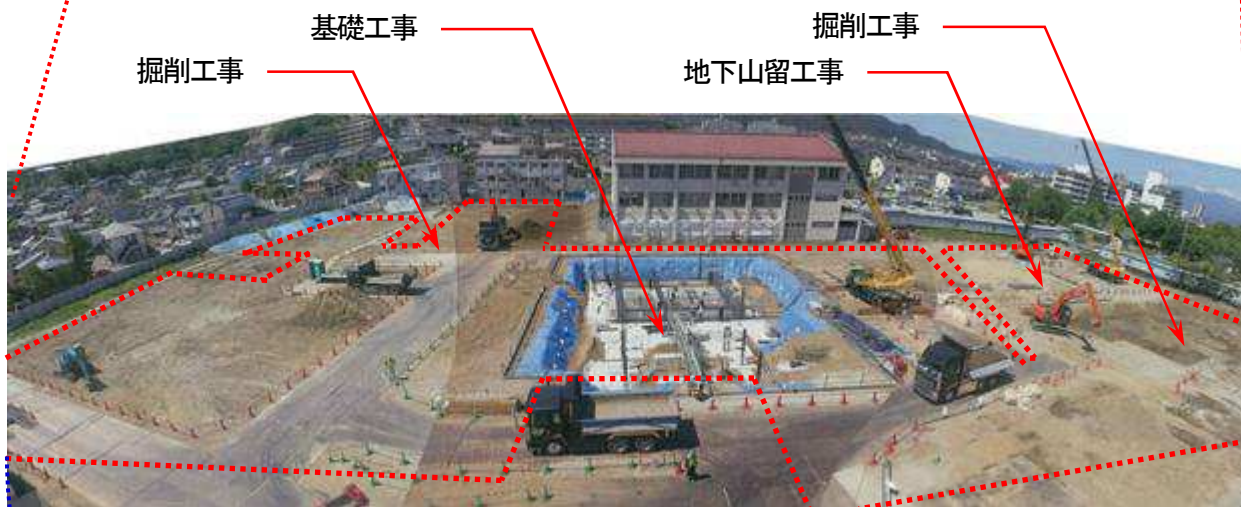

地盤改良（直径1m、1,360本）完了

進捗状況 平成28年6月3日現在

○ 新校舎：延べ面積 19,610平方メートル

構造 <校舎>SRC造 地上1階～4階、<体育館>S造 地下1階・地上1階


○ 発注状況

| 工事区分   | 契約相手方            | 契約日等                          | 契約額        |
|--------|------------------|-------------------------------|------------|
| 建築工事   | 大成・岡谷特定建設工事共同企業体 | 契約：平成28年3月14日<br>～平成29年11月30日 | 44億4,960万円 |
| 空調設備工事 | 協栄電気興業株式会社       |                               | 10億8,918万円 |
| 電力設備工事 | 信州電機株式会社         |                               | 5億7,024万円  |
| 弱電設備工事 | 株式会社TOSYS        | 契約：平成28年3月22日<br>～平成29年11月30日 | 1億5,012万円  |
| 衛生設備工事 | 金澤工業株式会社         |                               | 3億672万円    |

【後町キャンパス（学生寮、地域連携施設）：鳥瞰】



【1階平面図】

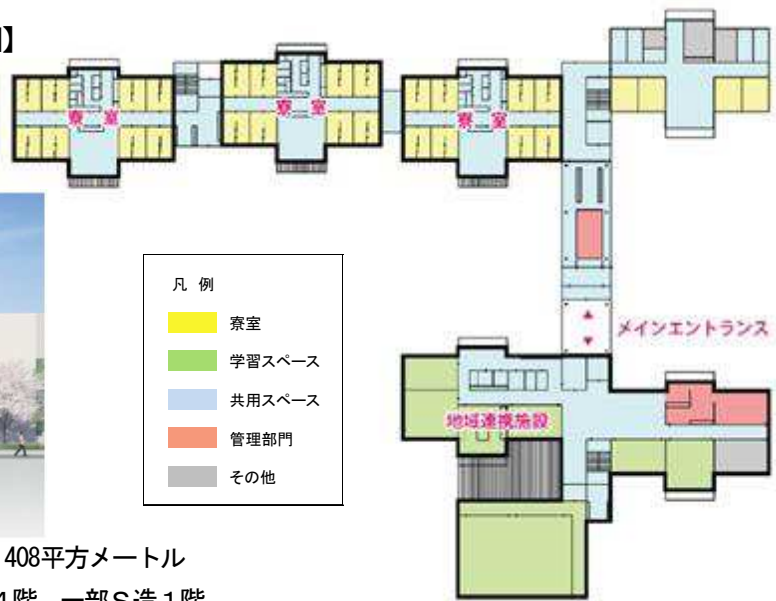

【エントランス】



- 教育寮・地域連携施設：延べ面積 6,408平方メートル  
構造 RC造4階 一部S造1階

○ 発注状況

| 工事区分 | 契約相手方    | 契約日等                      | 仮契約額       |
|------|----------|---------------------------|------------|
| 建築工事 | 北野建設株式会社 | 契約：H28.6県会議決日～平成29年10月23日 | 13億2,300万円 |

空調設備工事、電力設備工事、弱電設備工事、衛生設備工事：7月契約予定

2 スケジュール

| 区 分             | 平成27年度       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   | 平成28年度 |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |   | 平成29年度 |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |   | 平成30年度 |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|---|--------|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|---|--------|---|---|---|---|---|------|---|----|----|----|---|--------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 | 2            | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2      | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8    | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2      | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【三輪キャンパス】<br>校舎 | 基本設計⇒実施設計    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   | 校舎建設工事 |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |   | 開学準備   |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |   | 開学     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 幼稚園解体        |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   | 校舎解体 |   |    |    |    |   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 仮設道路・電気等切回し  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   | 既存改修 |   |    |    |    |   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 体育館（サークル棟）解体 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   | 外構   |   |    |    |    |   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 埋文発掘調査（西側）   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 【後町キャンパス】<br>寮  | 基本設計⇒実施設計    |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   | 寮建設工事  |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |   | 入寮     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 埋文発掘調査（長野市）  |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   | 外構 |   |    |    |    |   |        |   |   |   |   |   |      |   |    |    |    |   |        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
