

# 第11回「遠山郷いい川づくり」推進会議

平成30年度活動報告、31年度活動計画について



平成31年3月12日（火）  
飯田市南信濃自治振興センター

# 第10回「遠山郷いい川づくり」推進会議

## ■会議の内容

平成30年度の活動計画、工事内容の確認

## ◇意見、要望等

### 【推進会議について】

・毎年、年度初めと年度末に実施しているが、内容が重複するため、年度末のみの開催としてはどうか。

### 【河川愛護活動について】

・橋北地区、橋南地区、事務局の3者合同で1ヶ月前くらいに打合せを行ったらどうか。

## ①河川愛護活動

---

◇日時：平成30年7月8日（日）  
7:30～

◇内容：和田大橋上下流の草刈り

→豪雨により延期

→9～10月で実施予定も、台風により中止

## ②現地研修会

### ■研修会の内容

- ◇現場研修 平成31年2月15日 14:00~14:45  
〈場 所〉 かぐら大橋上流右岸側 親水護岸工 工事現場  
〈説 明〉 池端工業(株)  
〈内 容〉 事業概要、親水護岸工施工方法について  
〈出席者〉 9名

事業の説明



現場を見ながら説明



## ③平成30年度工事の進捗状況

---

◇和田（親水護岸工）

受注者：池端工業(株)

工 期：平成30年10月8日～  
平成31年5月15日

進捗率：68%（2月末時点）

# ③平成30年度工事の進捗状況

## 施工状況



## ④平成31年度 工事予定

---

◇工事箇所：かぐらの湯前 親水護岸工（階段工）

◇発注時期：平成31年7月


施工業者決定後、施工時期が決まった段階で回覧等により通知させていただきます。

◇工事期間：平成31年8月～平成32年3月


※予算の状況により施工範囲や発注時期が変更となる可能性があります。

# ④平成31年度 工事予定

## 平面図

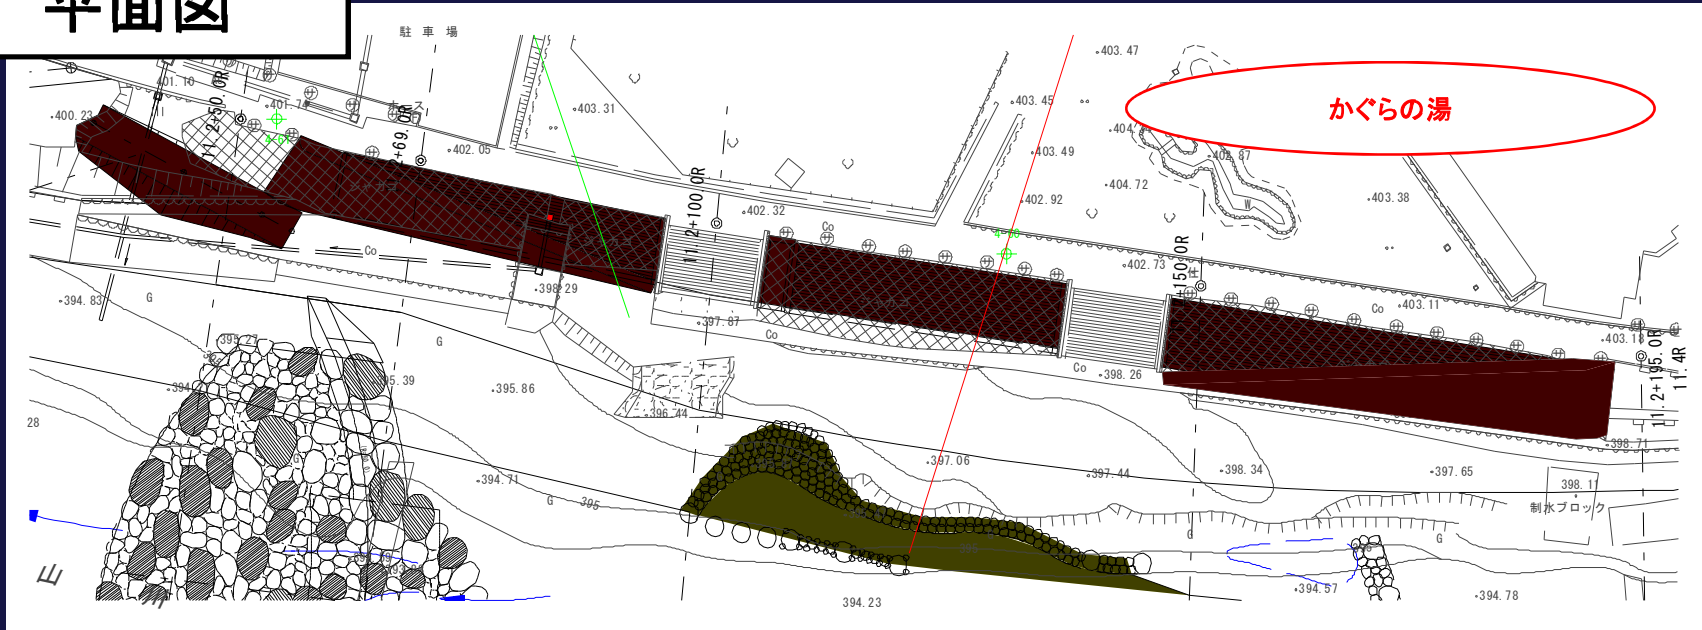

## 詳細図

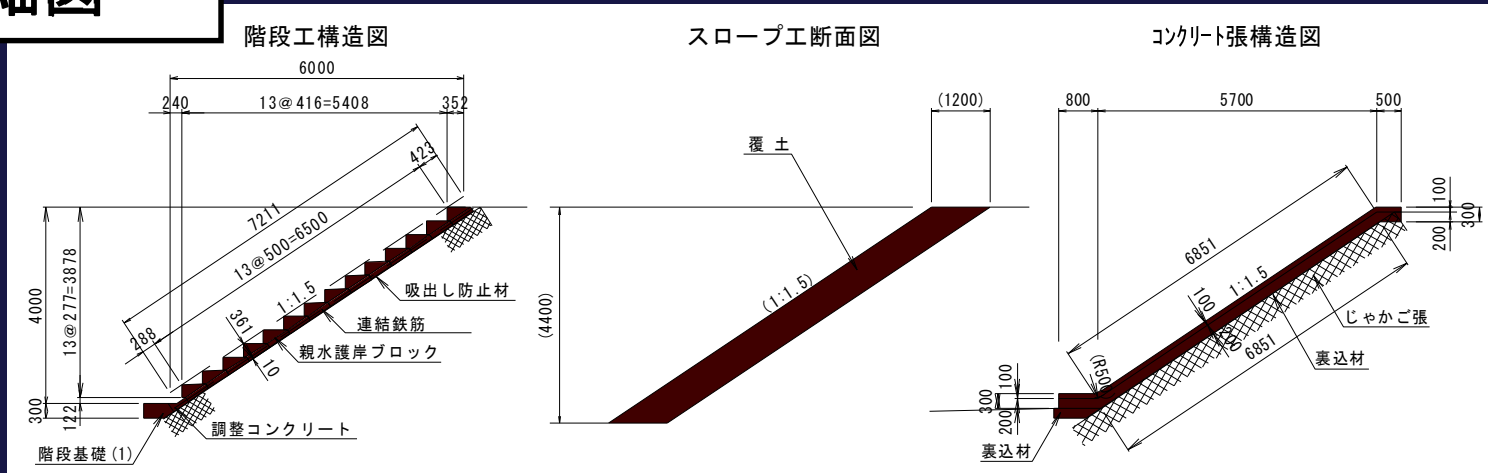



## ④平成31年度 工事予定



## ④平成31年度 工事予定



中橋下流左岸が豪雨や台風により浸食されてしまったため、覆土により補修をおこないます。

# ⑤平成31年度 河川愛護活動について

## 位置図

