

5区分	災害防止	25の施策分野	道路の落石対策等	事業名	道路災害防除
市町村名	上田市	ふりがな 箇所名	さなだとうぶせん さなだぼした すみやきばうえ (主)真田東部線 真田橋下～炭焼場上	工期 (年度)	当初 実績 H17～H20 H17～H19
当回事業費	200,000千円	費用対効果	当初	完了後経過年数	3年
最終事業費	160,088千円		評価時		
事業化の目的	道路法面の吹付モルタルが劣化し、崩落などにより交通への危険性があったため、ロックフェンスやロックネットにより安全な交通を確保する。				
事業等経過	当初計画内容	法面对策工 6箇所 L=564m、W=6.5(8.0)m (ロックフェンス工 25m、ロックネット工 260m 切土工123m アンカー工 66m 補強土工 90m)			
	最終事業内容	法面对策工 6箇所 L=559m、W=6.5(8.0)m (ロックフェンス工 0m、ロックネット工 280m 切土工 123m アンカー工 66m 補強土工 90m)			
	変更理由	ロックフェンスの設置予定箇所について、現地調査をした結果、法面上部に危険な転石がなかったため、施工しないこととした。			
費用対効果の算定の基礎となった要因の変化					
費用対効果は算定していない。					
社会経済情勢の変化					
特になし。					
評価内容					ランク
事業効果の発現状況(S:目的を超えた達成 A:達成した B:概ね達成 C:達成したとはいえない) 工事を実施した結果、法面の崩壊や落石などがなくなり、安全・安心な道路を確保できた。					A
事業実施に伴う自然環境の変化(S:環境がよくなった A:影響なし B:影響あり C:影響が大きい) モルタル吹付が施工されていた部分を切土工や補強土工で緑化しており、環境改善されている。					A
施設の維持管理状況(S:地域の人たちの参加あり A:適切にされている B:やや不十分 C:適切にされていない) 長野県が維持管理している。					A
地域住民等の評価(A:評価が高い B:中程度の評価 C:評価が低い) 工事の必要性、納得度について、7割の方から評価されている。					B
改善措置の必要性(A:改善の必要なし B:小規模な改善が必要 C:大規模な改善が必要) 当事業での改善措置の必要性はない。					A
事業の主たる目的以外で地域社会への貢献状況(A:貢献度が高い B:貢献している :特になし) 特になし。					
部意見	アンケートの結果から地域の評価も高く、安全・安心な道路が確保され、事業効果は高い。	政策評価 意見	道路の安全性の向上が図られ、一定の効果が認められる。		
今後の取組及び同種事業の計画・調査のあり方や評価手法の見直し等					
<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該道路における事業実施中はプレスリリースの実施などアピールする必要がある。</li> <li>・事後評価より事前評価を充実させてほしいとの住民意見があり、今後の検討が必要である。</li> <li>・事業実施を知らない人へのアンケートは無意味との指摘もあり、初期の質問でアンケート終了をするような内容とする必要がある。</li> </ul>					


5区分	災害防止	25の施策分野	災害防止	事業名	道路災害防除
市町村名	上田市	ふりがな 箇所名	さなだとうぶせん さなだばした すみやきばうえ (主)真田東部線 真田橋下 - 炭焼場上		

アンケートの方法及び対象


- ・ 方法  
別添アンケート用紙(3枚)を郵送し、内2枚を返送していただく。
- ・ 対象者  
主要地方道真田東部線に接する上田市長、本原、殿城地区及び東御市和、弥津、鞍掛地区に在住の方を主とする。電話帳に記載された方より抽出する。人口等を勘案し、上田市60人、東御市40人 合計100名を対象とする。(電話帳1ページ当たり一人)

アンケート結果 (アンケート実施者数100人 返信数33人 回収率 33%)


問1 あなたの性別は次のどれに該当しますか。




問2 あなたの年齢は次のどれに該当しますか。




問3 あなたの職業は次のどれに該当しますか。




問4 あなたのお住まいは次のどれに該当しますか。




問5 今回のアンケートの工事(箇所)をご存知でしたか。

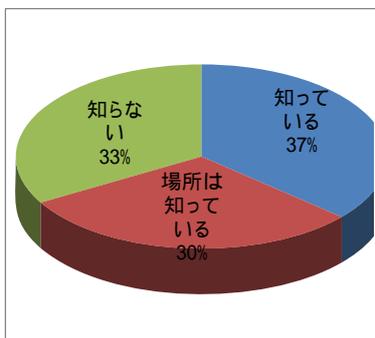


問6 - 1 行われた工事は、あなたにとって必要な工事だと思いますか。

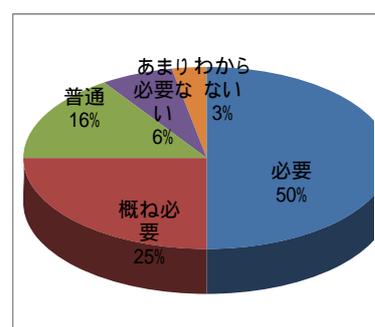


問6 - 2 さしつかえなければ、その理由をお聞かせください。

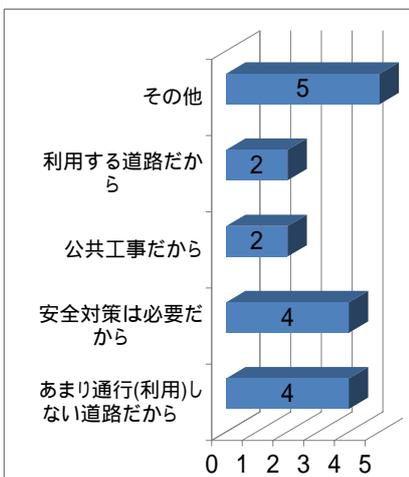

問7 - 1 行われた工事に税金が使用されたことに納得しますか。

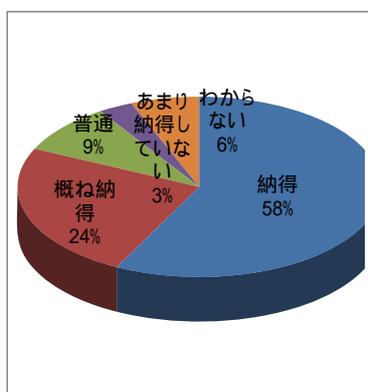


問7 - 2 さしつかえなければ、その理由をお聞かせください。

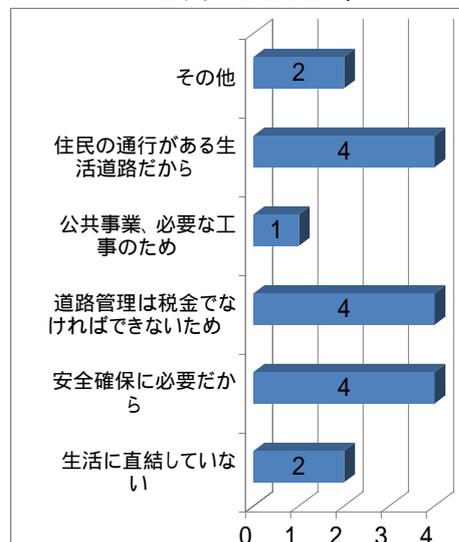


5区分	災害防止	25の施策分野	災害防止	事業名	道路災害防除
市町村名	上田市	ふりがな 箇所名	さなだとうぶせん さなだばした すみやきばうえ (主)真田東部線 真田橋下～炭焼場上		アンケート結果


問8-1 行われた工事は、地域社会にとって重要だと思いますか。

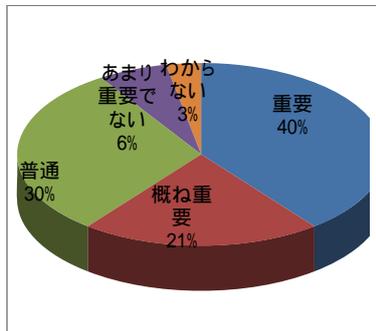


問8-2 さしつかえなければ、その理由をお聞かせください。

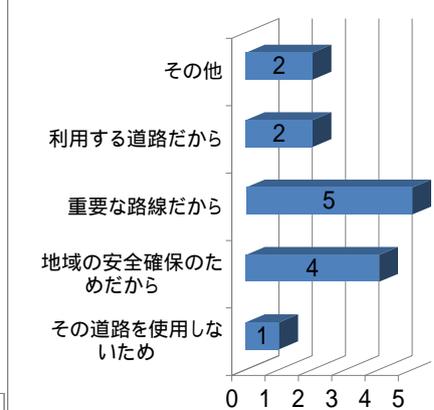


問9-1 この事業が完成した結果をみて、満足していますか。

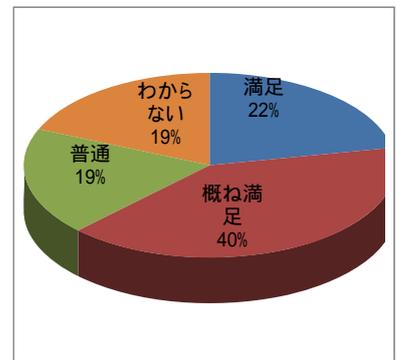


問9-2 さしつかえなければ、その理由をお聞かせください。

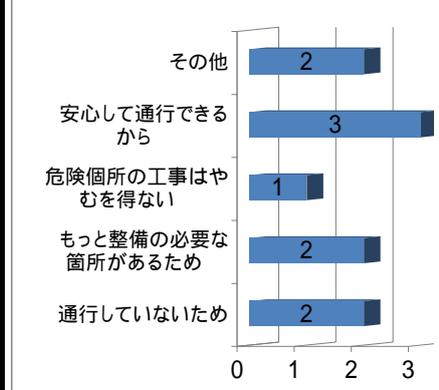


問10-1 当該道路の利用回数はどれくらいですか。

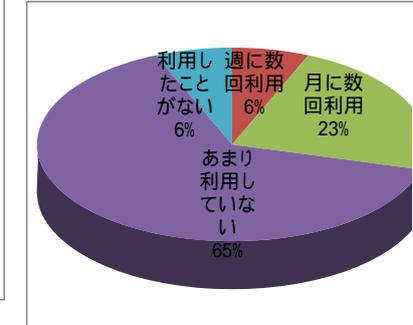


問10-2 【問10-1】で利用したことがあると回答された方は、利用目的はなんですか。

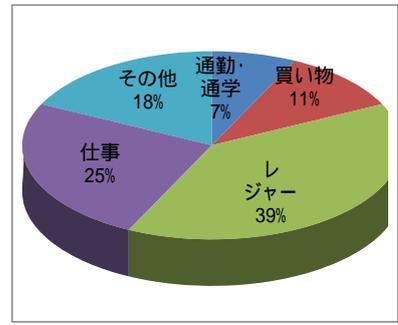


問11-1 事業の実施により、大気や水環境、植物や動物、景観などの自然環境の状況は、施工前と比べてどう変化しましたか

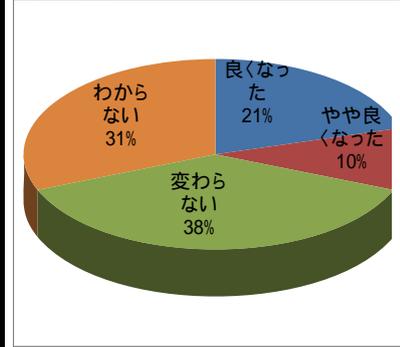

問11-2 さしつかえなければ、その理由をお聞かせください。

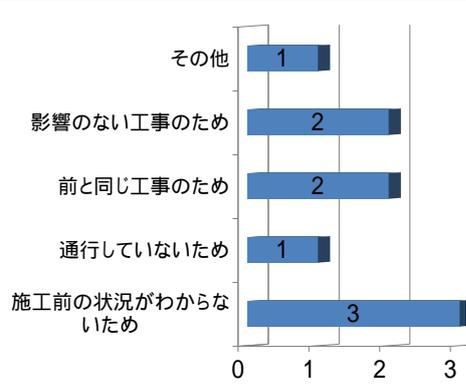

問12-1 行なわれた工事(完成した施設)について改善した方がよいと思う点がありますか。

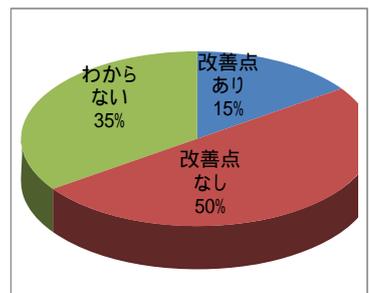

問12-2 改善点ありと回答された方は、さしつかえなければ、その内容をお聞かせください。

・もっと迅速に行ってほしい。・法面上部に(又は全体に)必要と思えるところがあるから。・段階的な施工が適切だから。

問13 アンケート箇所に対してその他の御意見・御要望等がございましたらお聞かせください。

・法面崩落前に工事は行ってほしい。・利用したことのない人へのアンケートは意味がない。・道路施設が未整備である  
 ・事前アンケートが重要と思う。・アンケートは無駄。必要な工事はこれによらず実施してほしい。  
 ・広く住民の意見を聞く事は良い事だと思います。・ゲリラ豪雨等に対して、防災面からの対応を更にお願ひしたい。  
 ・設問の答えから今後の事業に役立つデータを得る事が出来ると思えない。・危険ヶ所等の整備をお願いします。

問14 この箇所に限らず、公共事業について御意見等がございましたらお聞かせください。

・予算が少ないと思われるが、安全対策は優先して工事して欲しい。  
 ・県道、地方道で改善すべきところはたくさんある。担当者は常にパトロール等にて観察して欲しい。  
 ・もしくは一般市民に観察委任して常時意見を吸い上げたらどうか。  
 ・公共事業をどんどん進めて地方の活性化に貢献してほしい。・工事は、地域を平均に実施して頂きたい  
 ・他の区間の工事を優先してやっていただきたい。・他の箇所の舗装が悪い。手を抜かずにやってほしい。  
 ・古い橋やトンネルの点検、延命のための工事など必要と思います。・税金は有効に使っていただきたいと思ひます。  
 ・本当に必要であるところに投資するのは当然だが、ランニングコストの試算をきちんとやって判断してほしい。

5区分	災害防止	25の施策分野	災害防止	事業名	道路災害防除
市町村名	上田市	ふりがな 箇所名	さなだとうぶせん さなだばした すみやきぼうえ (主)真田東部線 真田橋下～炭焼場上		

施工前写真



施工後(現況)写真

