水処理施設の覆蓋を設置しています

●クリーンピア千曲では、流入汚水量の増加に合わせて計画的に施設の増設等の整備を進めています。
●水処理施設の覆蓋（水処理施設水槽部の屋根）は、施設の保護、維持管理や作業性の向上を図ります。

①環境への配慮（臭気の拡散、機器の騒音、害虫の発生等）
②冬期間における作業環境の確保と水温低下の防止
③経年によるコンクリートや機械電気設備の劣化防止
④覆蓋の上部利用（太陽光パネル等）

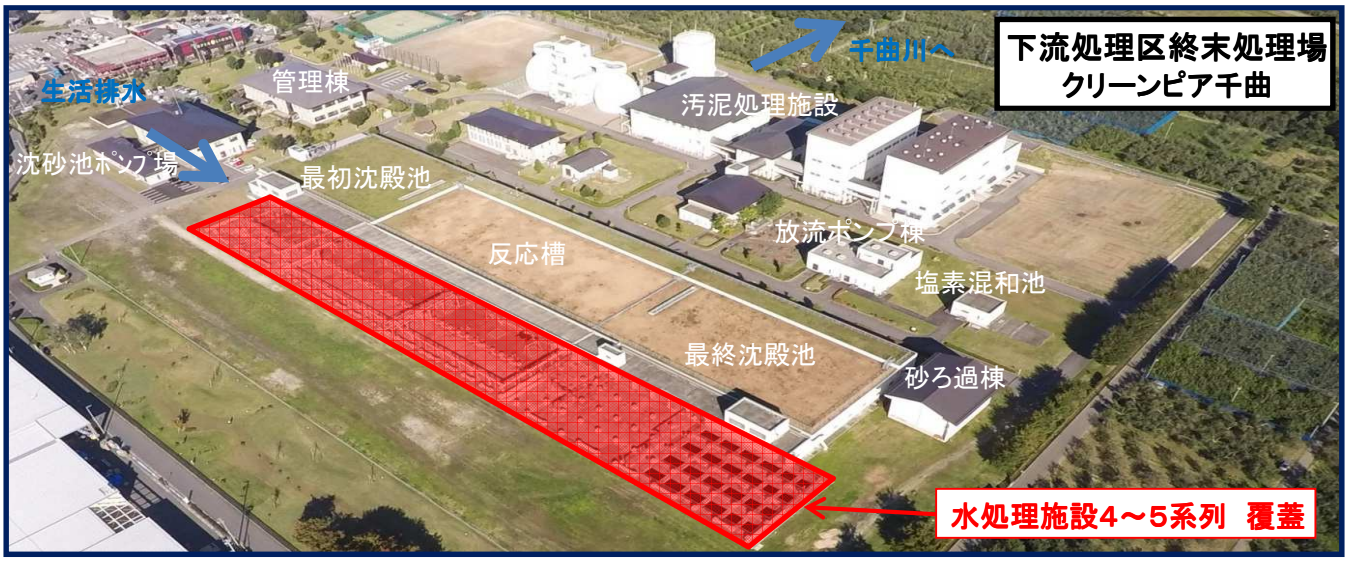

事　業　概　要

■工事名
平成28・29年度 社会資本整備総合交付金
流域下水道建設工事委託
下流処理区終末処理場建設工事

■工事概要
水処理４～５系列覆蓋工事　１式
最初沈殿池，反応槽，最終沈殿池の覆蓋設置
建築面積　5,752㎡

■施工業者
高木・北條特定建設共同企業体

■進捗率
７月末現在　約50%

概略断面図

覆蓋（建築）	1～3系覆蓋　設置済			4系覆蓋	5系覆蓋
水槽（土木）	1系水処理	2系水処理	3系水処理	4系水処理	5系水処理

施工箇所 4～5系列現況

覆蓋設置済　3系列現況

工　事　工　程　表

工種＼年月	平成28年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	平成29年度 4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
建設工事 契約							○																	
建設工事 準備工									■	■	■													
建設工事 最初沈殿池												■	■	■	■	■	■							
建設工事 反応タンク															■	■	■	■	■	■				
建設工事 最終沈殿池																	■	■	■	■	■	■		
建設工事 完成																							○	

施工状況（H29.7月現在）

施工状況（H29.7月現在）
