

5区分	食料	25の施策分野		過疎地域等の農業、生活基盤の整備	事業名	県営中山間総合整備	
市町村名	飯田市(旧南信濃村) 天龍村	ふりがな	てんりゅうみなみしなの 天龍南信濃		工期	当初	H10 ~ H14
当初事業費	1,600,000 千円		費用対効果	当初	(年度)	実績	H10 ~ H16
最終事業費	1,458,000 千円			評価時		完了後経過年数	5年
事業目的	農業用排水、農道等を整備することで、安定した用水供給と労力の軽減を図り、条件不利地の農業を支えている高齢者や女性にやさしい営農環境を創ることにより、農地の荒廃を防止する。また、集落道、防災安全施設等の整備により定住環境を整え、それらの総合的な対策により地域活性化を図る。						
事業等経過	当初計画内容	農業用排水 L=5,305m、農道 L=3,060m、農業集落道 L=3,010m、防災安全施設 8箇所、活性化施設 2箇所、農村公園 A=7,000m <sup>2</sup>					
	最終事業内容	農業用排水 L=4,752m、農道 L=3,081m、農業集落道 L=2,019m、防災安全施設 8箇所、活性化施設 1箇所、農村公園 A=1,678m <sup>2</sup>					
	変更理由	活性化施設及び農村公園の計画見直しにより実施面積が減となった。					
費用対効果の算定の基礎となった要因の変化							
評価時の費用対効果は算定していない。							
社会経済情勢の変化							
天龍村及び飯田市(旧南信濃村)では人口減少と高齢化が進行し、山間急傾斜地の持続的農業と集落の維持が課題となっている。							
評価内容						ランク	
						部	政策評価課
事業効果の発現状況(S:目的を超えた達成 A:達成した B:概ね達成 C:達成したとはいえない)						A	A
人口減少と高齢化は年々進行しており、農業と集落の維持が課題となっているが、地域住民へのアンケートによると、「農道、水路、集落道等が整備されたので農業を続けられる」との回答が多数あった。また、活性化施設「梅の里ふれあい館」を整備したことにより、地元活動グループが中心となった地域農産物加工、販売の活動が活発になったほか、都市住民との交流等においても核になるなど、地域活性化につながっている。							
事業実施に伴う自然環境の変化(S:環境がよくなった A:影響なし B:影響あり C:影響が大きい)						A	A
自然環境に配慮しながら事業を進めたため環境への影響は少ない。なお、地域住民へのアンケート結果でも自然環境が良くなった、やや良くなった、変わらないが大多数で、やや悪くなった、悪くなったは1%以下であった。							
施設の維持管理状況(S:地域の人たちの参加あり A:適切にされている B:やや不十分 C:適切にされていない)						A	A
農道、水路は事業により整備されたことで維持管理の軽減が図られ、受益耕作者による十分な管理作業(草刈り、清掃等)が行われている。また、活性化施設、農村公園、営農飲雑用水は飯田市及び天龍村により適正に管理されている。							
地域住民等の評価(A:評価が高い B:中程度の評価 C:評価が低い)						A	A
工事の必要性、納得度、重要性について、7割以上の方から評価されている。							
改善措置の必要性(A:改善の必要なし B:小規模な改善が必要 C:大規模な改善が必要)						A	A
当事業の改善措置の必要はない。							
事業の主たる目的以外で地域社会への貢献状況(A:貢献度が高い B:貢献している -:特になし)						B	B
活性化施設の「梅の里ふれあい館」は地域の集会等でも利用されているほか、災害時の避難施設として指定されるなど、地域社会へ貢献している。							
部意見	農業生産基盤の整備により、生産性の向上と農作業の省力化が図られた。また、定住環境の向上や、地域活性化にも貢献しており、事業の目的を達成している。			政策評価	課見	農業生産性と定住環境の向上が図られ、事業の目的を達成している。	
今後の取組及び同種事業の計画・調査のあり方や評価手法の見直し等							
事業に対する評価が高い反面で、アンケート実施時には、事業を実施していない箇所での事業実施要望や、他事業(鳥獣害防止等)の実施要望があったため、計画段階で地域の要望を的確に把握し、他事業との連携を含めた事業計画に反映させる必要がある。							







5区分	食料	25の施策分野	過疎地域等の農業、生活基盤の整備	事業名	県営中山間総合整備
市町村名	飯田市(旧南信濃村) 天龍村	ふりがな	てんりゅうみなみしなの 天龍南信濃		

アンケートの方法及び対象

・ 事業実施区域の天龍村で109戸、飯田市(旧南信濃村)で74戸とし実施した。


配付数：183 回収数：139 回収率：76%

アンケート結果

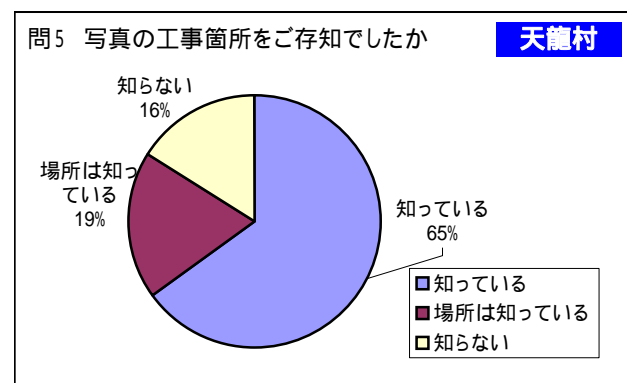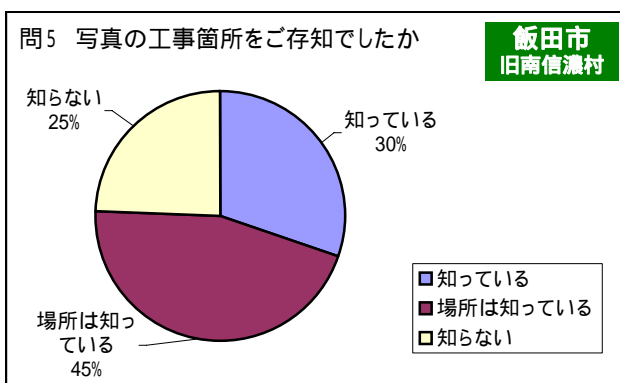


問6-1 この事業は必要な事業だと思いますか

飯田市  
旧南信濃村




問6-1 この事業は必要な事業だと思いますか

天龍村

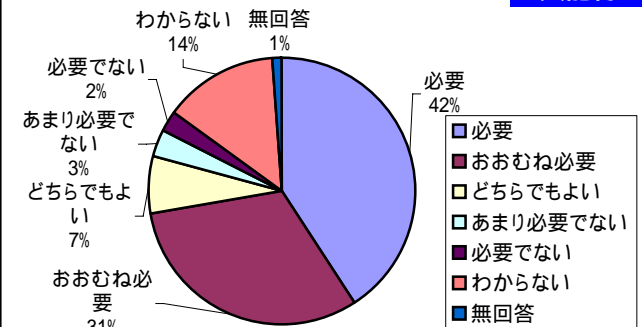


問6-2 必要または不要の理由

地域で生活に必要な事業であり、暮らしやすくなり村も活性化する農道、用水路は無くしてはならないし、受益者だけで工事はできない生活環境、生産条件の改善がされないと農業と地域が守れない急な道路や排水路の改修は必要で、緊急車両がはいるように工事箇所が少なく手つかずの所が多い為、今後も継続してほしい梅の里は当初必要と思ったが、若者が流出しているため不必要利用する人にとっては必要だが、特定の場所にかたよっている直接関係なく、あまり使用していない

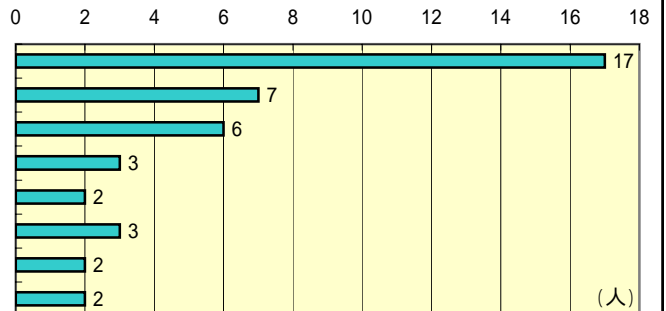


問7-1 この事業に税金が使われたことに納得しますか

飯田市  
旧南信濃村




問7-1 この事業に税金が使われたことに納得しますか

天龍村

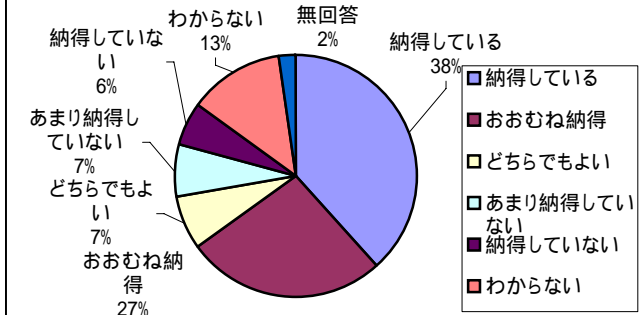


問7-2 納得する・しないの理由

自力では不可能。税金等を使って支援頂かないと改善できない社会資本の整備に税金が使用され地域が良くなるのは良い事村にとって有意義な補助事業で、公共の利益になるから食料自給率の低い我が国において、農業振興を図るため必要工事費等知らされていないし、他にやることがある事業で整備されたので、今後集落整備は最小限にしても良い利用者から一部負担していただいているので

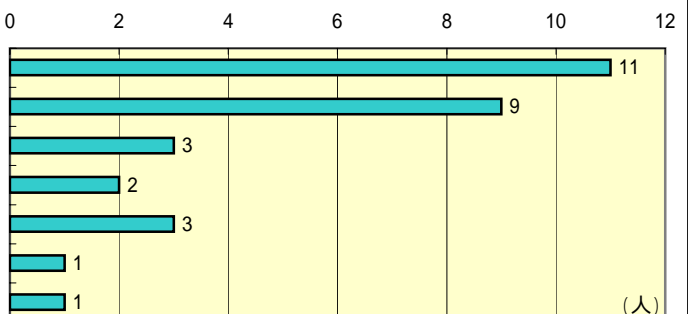


問8-1 この事業は地域社会にとって重要だと思いますか

飯田市  
旧南信濃村

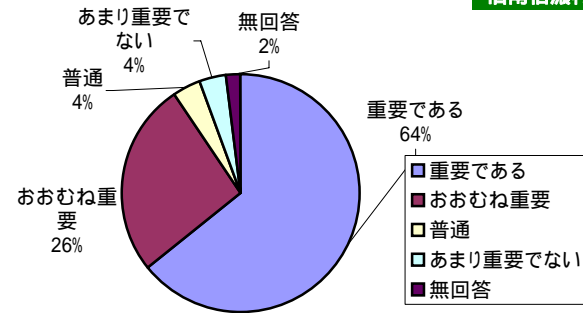


問8-1 この事業は地域社会にとって重要だと思いますか

天龍村




問8-2 地域社会にとって重要であるかそうでないかの理由

農業、農村生活に欠かすことのできない事業である。  
 用排水路は防災の面でも重要、道路整備は言うまでもなく必要  
 高齢者が病院に車で行くなど、集落道整備は最も重要  
 道路や水路は地域になくはならないし、活性化に貢献している  
 梅の里は部落のよりどころで、有事の際には重要な拠点となる  
 中山間総合整備事業で整備して頂いたので有り難い。  
 ふれあい館は人口が少なくなっているため管理などが大変  
 直接関係無いし、他にやることある  
 重要とあまり重要でない地域がある。利用者の一部負担必要  
 極端ですが夜警国家なら公共財産の整備はそんなに必要ない

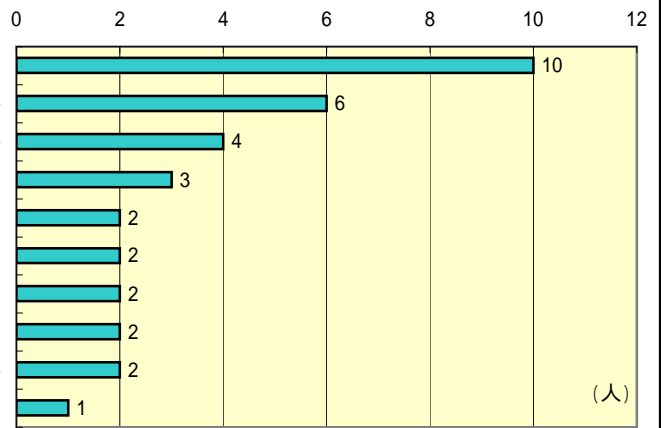


問9-1 この事業が完成した結果をみて満足していますか

飯田市  
旧南信濃村

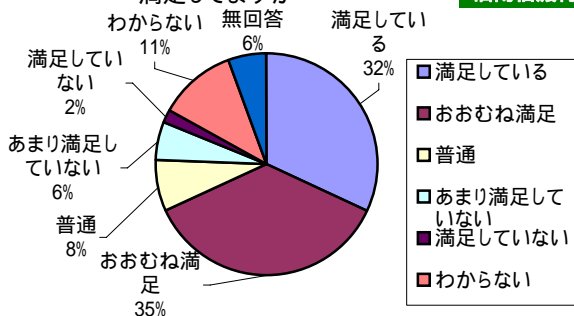


問9-1 この事業が完成した結果をみて満足していますか

天龍村

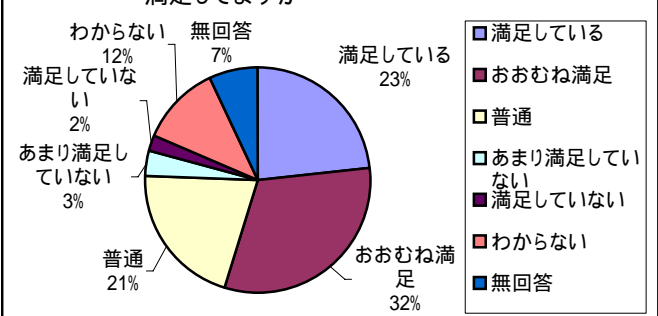


問9-2 満足している・していないの理由

完成した道路や水路が使いやすく、住民が納得している  
 水路の維持管理が楽になり、農道など出来た物がすごく生きている  
 丁寧な仕事で安心できる。  
 集落道整備がもう少し広がったら良かった。カーブが通行しにくい  
 近くで工事をしていない。もっと他の場所でも工事をしてほしい  
 不必要な箇所もあり、地元意見を取り入れていない。  
 地権者の反対により農道が2箇所つながっていないのが残念  
 比較対象や他の基準的なものが分からない

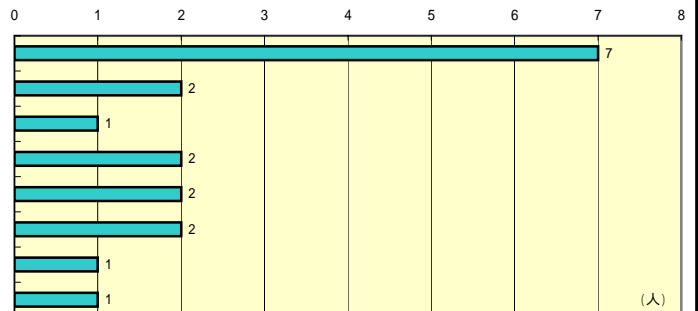


問10-1 自然環境について施工前と比べて変化はどうか

飯田市  
旧南信濃村

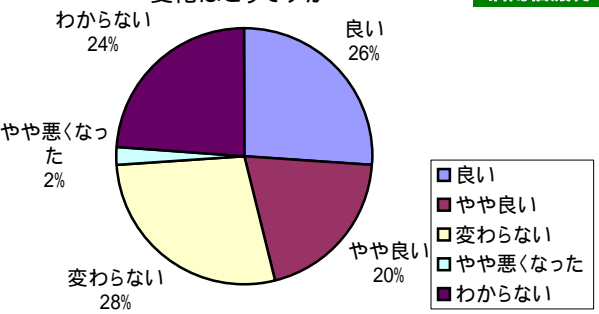


問10-1 自然環境について施工前と比べて変化はどうか

天龍村

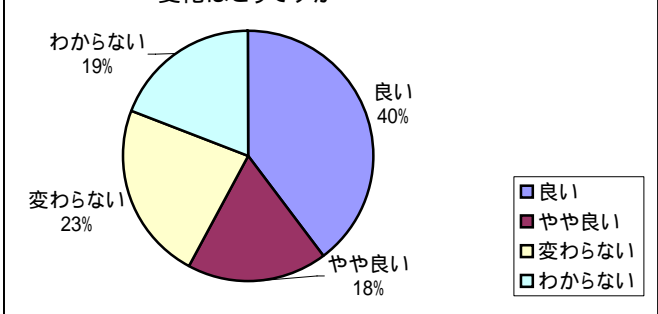


問10-2 自然環境の施工前との変化

事業の成果が認められ、全体的に良好な環境  
 自然環境について「破壊された」という事はない  
 必要であれば、少しの環境破壊はやむをえない。  
 工事箇所全てを知っているわけではないのでわからない  
 まだ落石等があり、危険な箇所がある  
 建物が無ければ草が生い茂っていたと思う

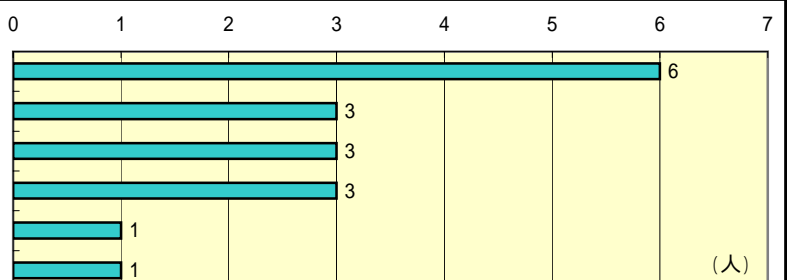


問11-1 行われた事業について改善点はありますか

飯田市  
旧南信濃村

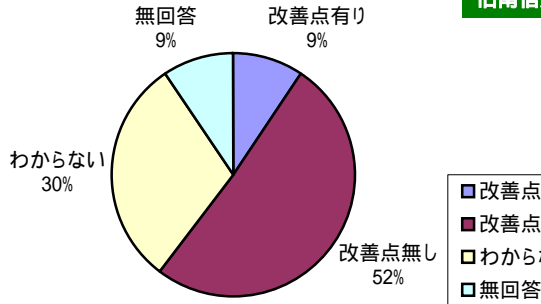


問11-1 行われた事業について改善点はありますか

天龍村

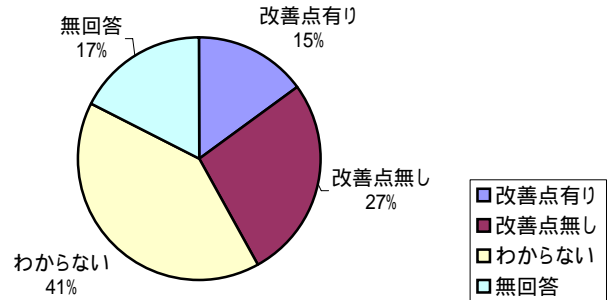

問11-2 改善点の内容

0 0.5 1 1.5 2 2.5



問12 本事業に対する意見・要望

工事(換地)に関する意見

- 中山間地域の生活を守って行くために大変役立っており、まだまだ整備していただきたい箇所があるので、事業を進めていただきたい。(6名)
- 地域農業と生活がより良くなるために、今後もお願いします。自然環境も取り入れると良い。
- 大変良い事業だと思います。後の管理を地元住民がしっかりする必要があります。
- 中山間事業は地域の実態に即したもので、改善の成果が認められるので、今後も存続を御願いたい。
- 中山間地域は高齢者がほとんどで、耕作地まで道路が整備されていれば農業を続けられる。
- 条件が不利な中山間地域にとって大変ありがたい事業で、今後も継続していただきたい。
- 中山間事業は地域に貢献したので、大いに実施すべきだと思う。(2名)
- 年寄りばかり残っており、長生き出来るよう中山間事業をもっと取り入れてやって頂きたい。(3名)
- 遠山郷に住みやすくなると良い。
- 大河内の農道をつないで1本にしてほしい。
- 今後やってほしい箇所の陳情があったらよろしく御願います。
- 中山間事業で整備が進んだので、これ以上の道路整備は必要ない。今後は国道整備に予算をまわすべき。
- 八重河内の方にも力を入れて下さい。(2名)
- 着工前に話し合いをしてあるのに、出来上がった所をみると違っている。
- 農道は必要でない箇所もあり、他に作ってほしいところがある。(3名)
- 出来上がった箇所でもやり直しができますか。

事業の実施方法等に関する意見

- 農村公園について、その後の利活用が残念。計画は慎重に。
- まとまった農地の場所では農道や水路を整備してもらえが、1戸での営農は何もしてもらえない。資材等の現物支給も考えてほしい。
- 仕事を始める前に自治会へお知らせ下さい。
- 県の事業として要望に早急に対応してほしい。
- 要望地区が多いと思いますが、必要性を考えて優先順位を決めて実施してほしい。

その他

- 梅の里ふれあい館は一部の人がばかり使っていると文句を言う人がいるので、もっと研修や加工実習に使えば良い。
- 梅の里ふれあい館は小梅の会が主に使っており、その人達のためにあるような気がする。(3名)
- 作物を荒らす動物が近くまで来て困る。

### 問13 公共事業についての意見等

#### 公共事業のあり方等

- ・地域の活性化につながり、仕事にも活気があふれるので、公共事業を増やしてほしい。
- ・農林業の振興、地域生活の維持発展のため、中山間事業の二期、三期と力強く推進してほしい。
- ・工事のおかげで改善された農家、集落はその恩恵に感謝し、完成した施設を大切にしてほしい。
- ・この地域に人を呼び込むためにも道路改良は必要で、公共事業、特に土木工事は推進してほしい。
- ・公共事業は地域のためにも減らさないでほしい。
- ・この地域は公共事業の依存度が高く、生活の基盤となるもの。道路の改良が必要な箇所は多くある。
- ・山間部は道路の整備が遅れており、特に車のすれ違い場所の増設を希望します。
- ・歩道の整備、用水路、農道など小規模な事業も取り入れてほしい。
- ・企業もだんだん撤退しており、公共事業を多くしてもらい地域を活性化させ、二世、三世に地域を引き継いでいきたい。
- ・我々高齢者にとって、国道よりも地域の道路整備の方が最重要であります。
- ・早く自分の家まで道路がほしい。せめて半分でも。
- ・この地域に若者が定住できるようにしてほしい。
- ・集中的に公共事業をやってほしい。
- ・皆の税金だからお金をかけ過ぎないでうまく使ってほしい。借金は減らした方がよい。
- ・県の公共事業は予算が小さい。国道を早く整備してほしい。
- ・高齢化により、用水路の維持管理に手がかかり心配。
- ・悪い箇所があったら自由に申し出られるように指導してほしい。
- ・この地区は落石の心配が多く、対策を御願いたい。
- ・大事な事と無駄な事を良く見極めて公共事業を実施した方がよい。



5区分	食料	25の施策分野	過疎地域等の農業、生活基盤の整備	事業名	県営中山間総合整備
市町村名	飯田市(旧南信濃村) 天龍村	ふりがな箇所名	てんりゅうみなみしなの 天龍南信濃	農道整備「松の田」	

施工前写真



施工後(現況)写真



5区分	食料	25の施策分野	過疎地域等の農業、生活基盤の整備	事業名	県営中山間総合整備
市町村名	飯田市(旧南信濃村) 天龍村	ふりがな箇所名	てんりゅうみなみしなの 天龍南信濃	農業用排水施設整備「原」	

施工前写真



施工後(現況)写真





5区分	食料	25の施策分野	過疎地域等の農業、生活基盤の整備	事業名	県営中山間総合整備
市町村名	飯田市(旧南信濃村) 天龍村	ふりがな箇所名	てんりゅうみなみしなの 天龍南信濃		農業集落道整備「夜川瀬」

施工前写真



施工後(現況)写真



5区分	食料	25の施策分野	過疎地域等の農業、生活基盤の整備	事業名	県営中山間総合整備
市町村名	飯田市(旧南信濃村) 天龍村	ふりがな 箇所名	てんりゅうみなみしなの 天龍南信濃	活性化施設整備「梅の里ふれあい館」	

施工前写真



施工後(現況)写真

